

LEVERANSBESKRIVNING

TAK

Råspont 17, takåsar 43 x 195, enkel vindskiva 21 x 145 och 21 x 170, takfotsbräda 21 x 120.
Taklutning ca 8°.

YTTERVÄGG

Färdiga väggsektioner med funkispanel 14 x 120, regelstomme 34 x 70, vindpapp,
knutbräda 21 x 95.

GOLV

Bärlina 100, bottenram / bjälklag 34 x 120, underlagsgolvträ 21 mm.

FÖNSTER

2 st 6 x 18 fasta, 2 st 9 x 4 öppningsbara, monterade, aluminium, vita

DÖRR

Skjutglasparti 40 x 20, aluminium, vit

PLÅT

Fönsterbleck och underbleck vid skjutglasparti, vit.

ÖVRIGT

Beslag, spik och skruv ingår.
Ventilgaller

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, materialbeskrivning och byggbeskrivning.

JABO ROSENLUND 15 N

LEVERANSBESKRIVNING

DIMENSIONSFRÖUTSÄTTNINGAR

JABO ROSENLUND 15 N är dimensionerad för följande laster enligt BKR.

Tak: Snözon 2,5 + egenvikt ca 0,6 kN/m².

Vid placering av JABO ROSENLUND 15 N inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

JABO ROSENLUND 15 N**DEL 1**

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
V32	1	Väggblock med 1 fast fönster monterat 6x18	FV907		1650		
V33	1	Väggblock med 1 öppningsbart fönster monterat 9x4	FV908		1650		
V34	1	Väggblock baksida	FV909		2112		
V35	1	Väggblock baksida	FV910		2112		
V36	1	Väggblock med 1 öppningsbart fönster monterat 9x4	FV911		1650		
V37	1	Väggblock med 1 fast fönster monterat 6x18	FV912		1650		
	2	Ihopspikade stolpar till V1 jackade	SH069	111X70	2305	X	

Batchnr:

Sign:

This product is carefully
packaged and controlled by:

Nr:

JABO ROSENLUND 15 N**DEL 2**

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
	29	Golvträ	GB093	21x120	4220		X
	50	Råspont	RS030	17x95	5100		X
	1	Takfotsbräda bak	TH22120026	21x120	5100		X
	2	Vindskivor sidor	TH22145010	21x145	4500		X
	2	Vindskiva front + täckbräda front	TH22170012	21x170	5100		X
	1	Täckbräda bak	TH22120010	21x120	4500		X
	8	Knutfoder	TH2295004	21x95	2700		X
	2	Foder under skjutdörr	SL020	21x21	2100		X
	8	Takåsar	SR45195003	43x195	4103	X	
		Stödregel vindskiva + vid takstolar	SR3535023	34x34	16 m		X
		Överbräda + Glespanel till V1	TH2270011	21x70	19 m		X
	15	Funkispanel till V1	PL1412060	14x120	2700		X
	1	Limträbalk	LT004	66x315	4156	X	
	1	Bärlina	BL042	47x100	4500		X
	2	Bottenram	BL3512092	34x120	4364	X	
	11	Bottenram + bjälklag	BL3512093	34x120	3232	X	
	1 pkt	Karm + beslag till skjutdörrspartiet vit					
	1 sats	Underbleck till skjutdörren vit	PA025		4 m	X	

VÄND!

JABO ROSENLUND 15 N**DEL 2**

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
		Spik- och beslagspåse innehållande:	SB125				
	1 pkt	Trådspik á 200 st	SS409	100x3,4			
	3 pkt	Trådspik á 250 st	SS406	75x2,8			
	2 pkt	Trådspik á 500 st	SS403	60x2,3			
	100 st	Ankarspik	SS202	40x4,0			
	12 st	Vinkelbeslag till en sida takåsar	BB201	60x60x40			
	1 ps	Skruv á 150 st	SK011	5x60			
	30st	Montageskruv vit till karm skjutdörrskruv	SK012	4,2x45			
	2	Ventilgaller	IK071				

Batchnr:

This product is carefully
packaged and controlled by:

Sign:

Nr:

JABO ROSENLUND 15 NDEL 3

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
	1	Skjutdörrsparti aluminium vit	FÖ402001	40x20			

Batchnr:

Sign:


This product is carefully
packaged and controlled by:

Nr:

BYGGBESKRIVELSE

JABO ROSENLUND 15 N

Norska - 2015-02-03

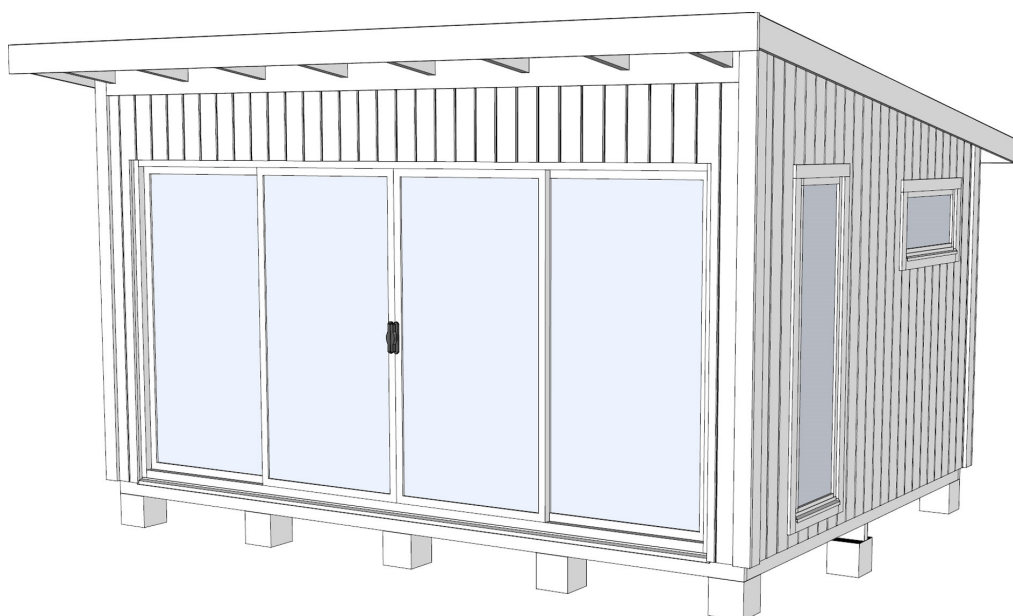

Innholdsfortegnelse:

- Byggbeskrivelse
- Materialbeskrivelse
- Vedlikehold, maling og ventilasjon
- Tegninger 1156 A01 - A06
- Monteringsanvisning for skyveparti 2010B

For at du skal bli fornøyd med ROSENLUND 15 N må den føres opp i henhold til anvisningene.

Les derfor gjennom disse beskrivelsene og studer de tilhørende tegningene nøye.

Kontroller detaljplanløsning m.m.

Anvend riktig verktøy.

Kontroller materialleveransen mot materialspesifikasjonen. Sorter i hensiktsmessige grupper.

OBS! Alle materialer skal beskyttes mot vær og vind under lagring og oppføring. Dekk til med plast eller tilsvarende. Spesielt viktig er det at takbordene på taket beskyttes før underlagspappen kommer på.

Kapp aldri av biter før du har kontrollert at riktig bit kappes og med riktige mål.

Utfør monteringen i henhold til byggebeskrivelsen.

Studer våre anvisninger for "UNDERHÅLL/MÅLNING" (på svensk) før du begynner arbeidet.

Tips! Før montering skal bunnramme, bjelker og bærelekt behandles med et beskyttelsesmiddel for treverk. **OBS!** Er gulvet isolert skal ikke bjelkene behandles. Spør om råd hos en fargehandel.

Det skal monteres ventiler for å unngå fukt- og muggproblemer. Sag/bor opp hull, og monter ventilene så nær hvert takmøne som mulig.

GARANTIE GJELDER IKKE DERSOM DETTE IKKE GJØRES.

Skal du isolere hytten, les våre isoleringsanvisninger før monteringen påbegynnes.

1. Gjennomfør grunnarbeider og fundamentering iht. **tegning A01**.

Fundamentsøyler kan bestå av Leca-blokker, betongstein, støpte søyler eller tilsvarende.


Fundamentsøyler skal settes opp på setningsfritt underlag.

OBS! Fundamentsøyler under bærelekt skal være 100 mm lavere enn øvrige søyler, se **tegning A01**.

Sjekk for fukt og eventuelle dreneringsproblemer.

TENK FOREBYGGENDE!

Planer bakken under og omkring fundament, sørg for at underlaget heller vekk fra bygget.

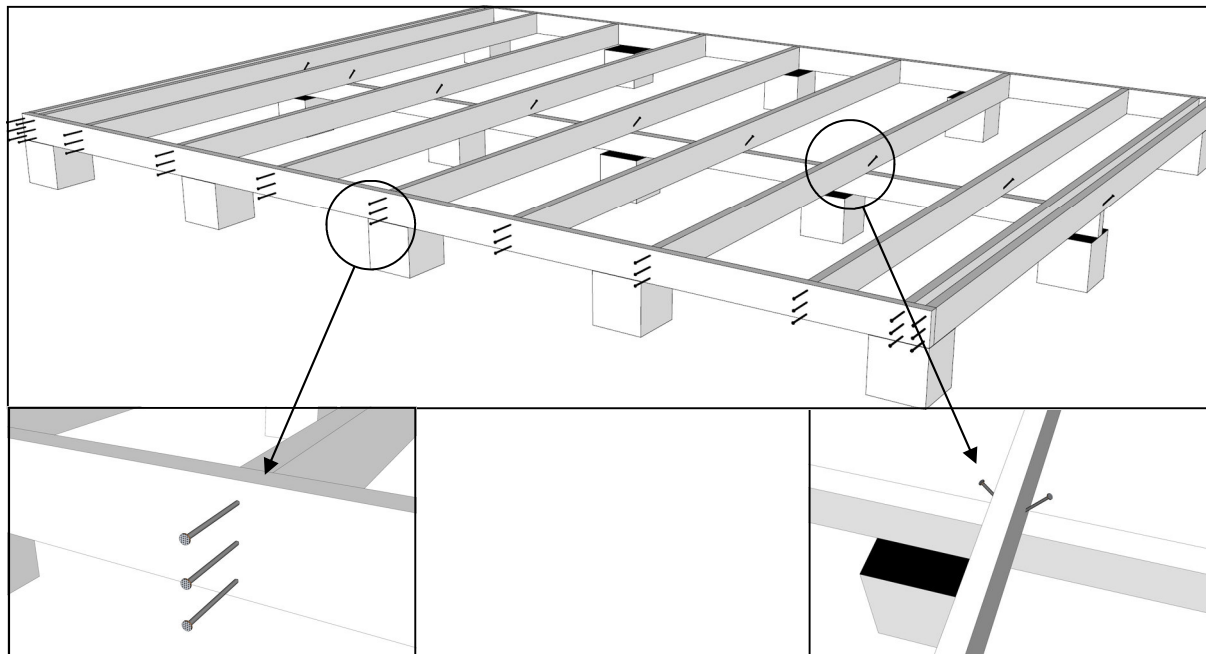

2. Legg ut bjelkelaget på bakken ved siden av søylefundamentet.

Spikre sammen iht. målangivelsene på **tegning A06**. Hver bjelke spikres fast med 3 spiker, 100 x 3,4. Plasser bærelekten på den midterste søyleraden.


Flytt det sammenspikrede bjelkelaget oppå søylefundamentet.

Plasser deretter grunnmurspapp (følger ikke med i leveransen) mellom søylene og bunnrammen/bærelekten. Vatre hele bjelkelaget med vaterpass.


Kontrollmål for å sjekke at begge diagonalene på bunnbjelkelaget er like lange.

Skråspikre fast bærelekten ved hver bjelke med 2 spiker, 100 x 3,4, én fra hver kant.


Forankre bjelkelaget til hver fundamentsøyle iht. de forutsetninger som gjelder på byggestedet. (Materiale for innfestning følger ikke med i leveransen.)

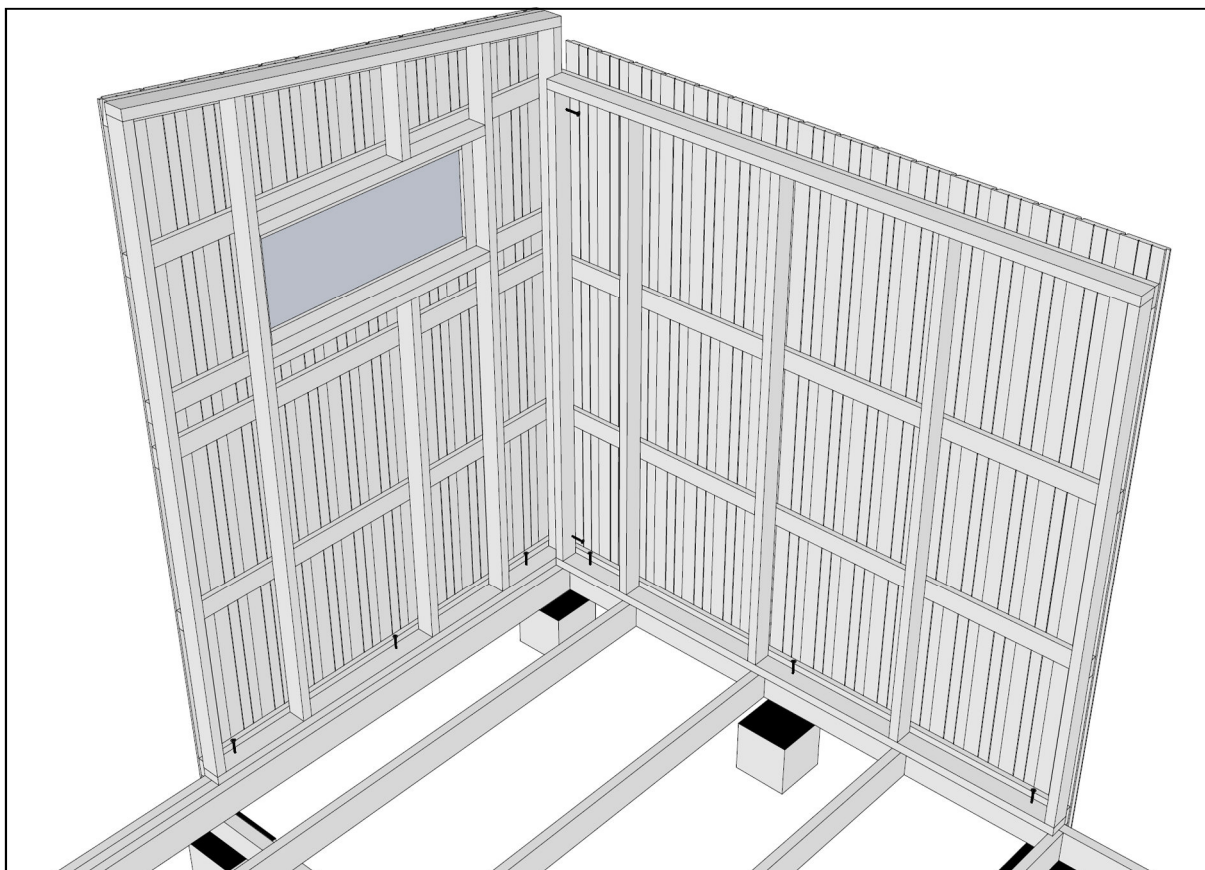


3. Monter veggseksjonene iht. **tegning A03**. Begynn i et valgfritt hjørne, og fortsett videre rundt. Skru veggseksjonene til bunnrammen og gulvbjelkelaget med 5,0 x 60 skruer, 3 skruer i hver seksjon. Støtt opp og lodd veggseksjonene. Ved sammenføring av hjørne, se detalj på **tegning A03**, bilde til høyre. Skru sammen hver veggseksjon gjennom lektene, 1 skrue oppe og 1 skrue nede, 5,0 x 60.

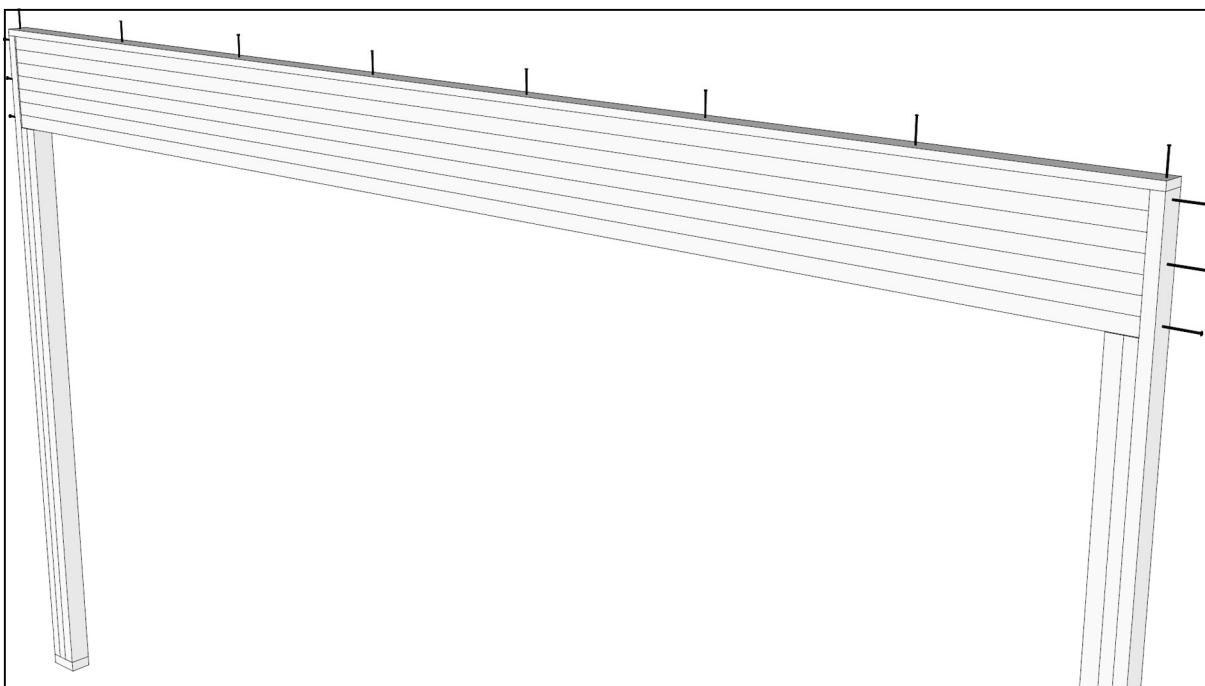


4. Avslutt med å montere veggseksjon V1. Dette bør gjøres på bakken. Spikre sammen de ferdige stolpene, 111 x 70, med limtrebjelken, 66 x 315, med 100 x 3,4 spiker, 3 på hver side. Spikre også fast overliggende bord, 21 x 70, på limtrebjelkens overside, bruk spiker 75 x 2,8, c/c 600.

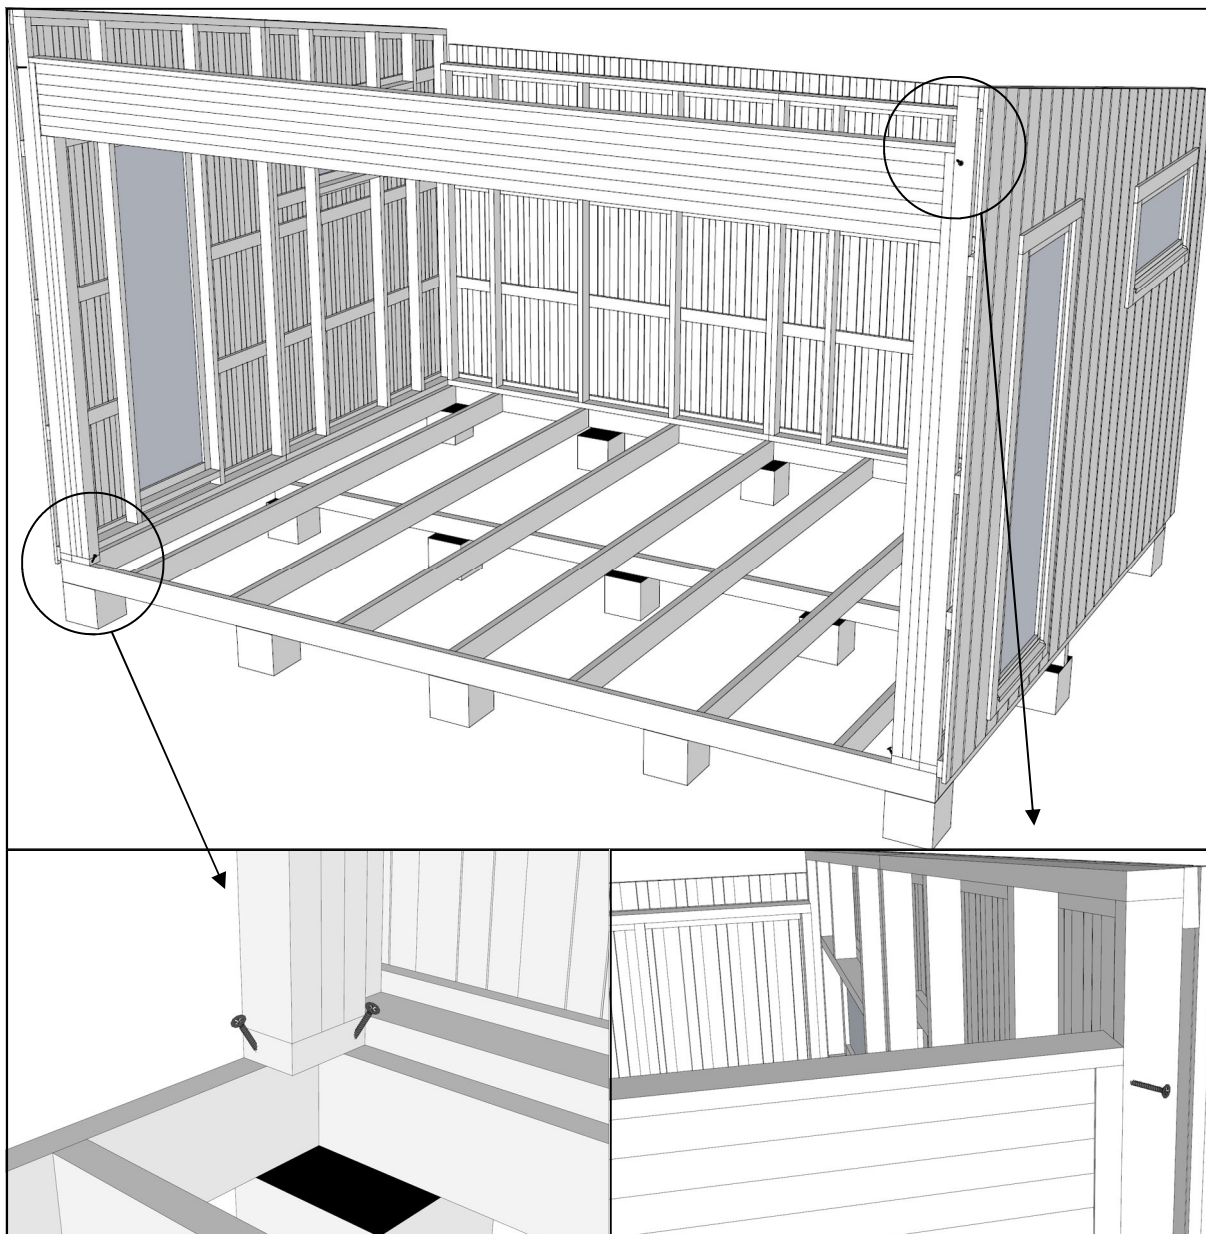


5. Reis opp veggseksjon V1, og skur den fast til bjelkelaget med 2 skruer, 5,0 x 60. Skru den også fast i veggjørnet oppe, se bildet til høyre.

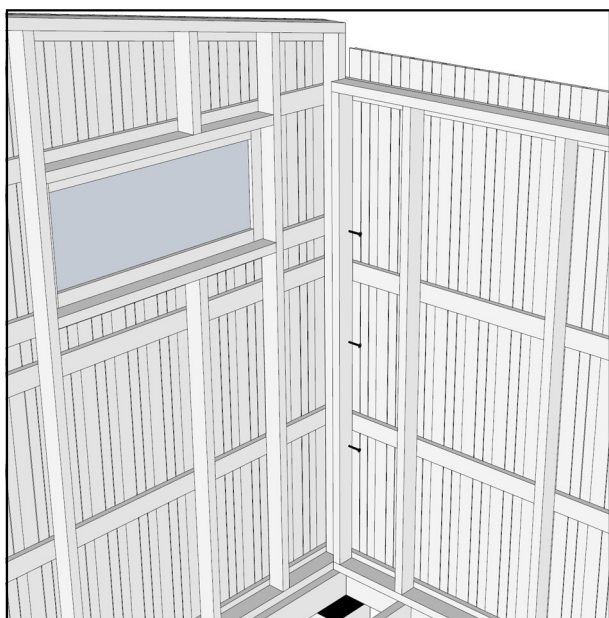


6. Kontroller med vater at alle seksjonene er loddrette. Når alt er tilfredsstillende, skal veggseksjonene skrus sammen med ytterligere 3 skruer, 5,0 x 60.

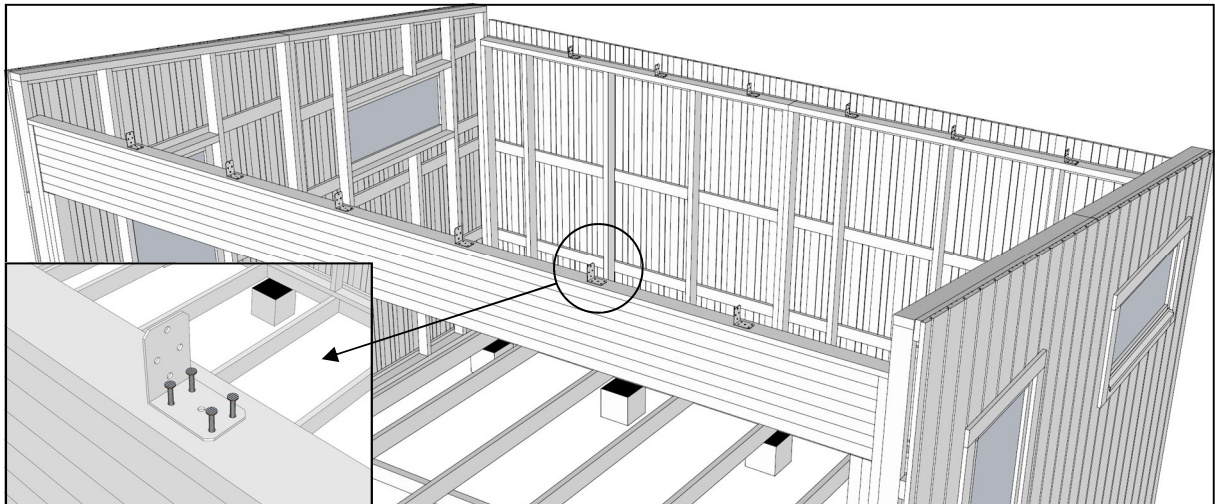


7. Merk av hvor takåsene skal ligge, se **tegninger A04 – A05**. Spikre fast vinkelbeslag på siden der det er merket av for takåsene. Bruk fire 4 ankerspikere, 40 x 4,0.
OBS! Dette er ikke nødvendig i de ytterste takåsene.

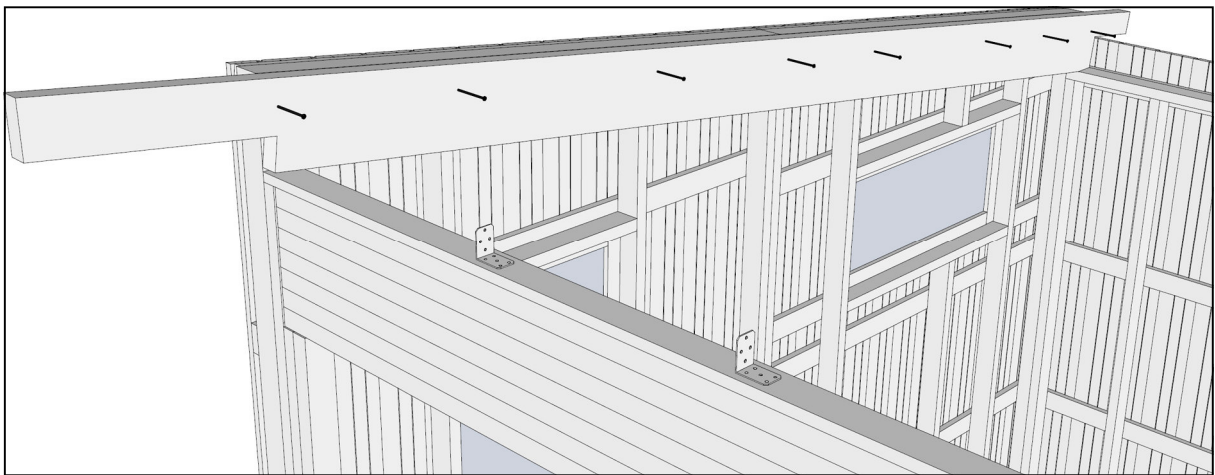


8. Monter opp de 2 ytterste takåsene, spikre dem fast med 1 spiker, 100 x 3,4, i hver stående vegglekt.

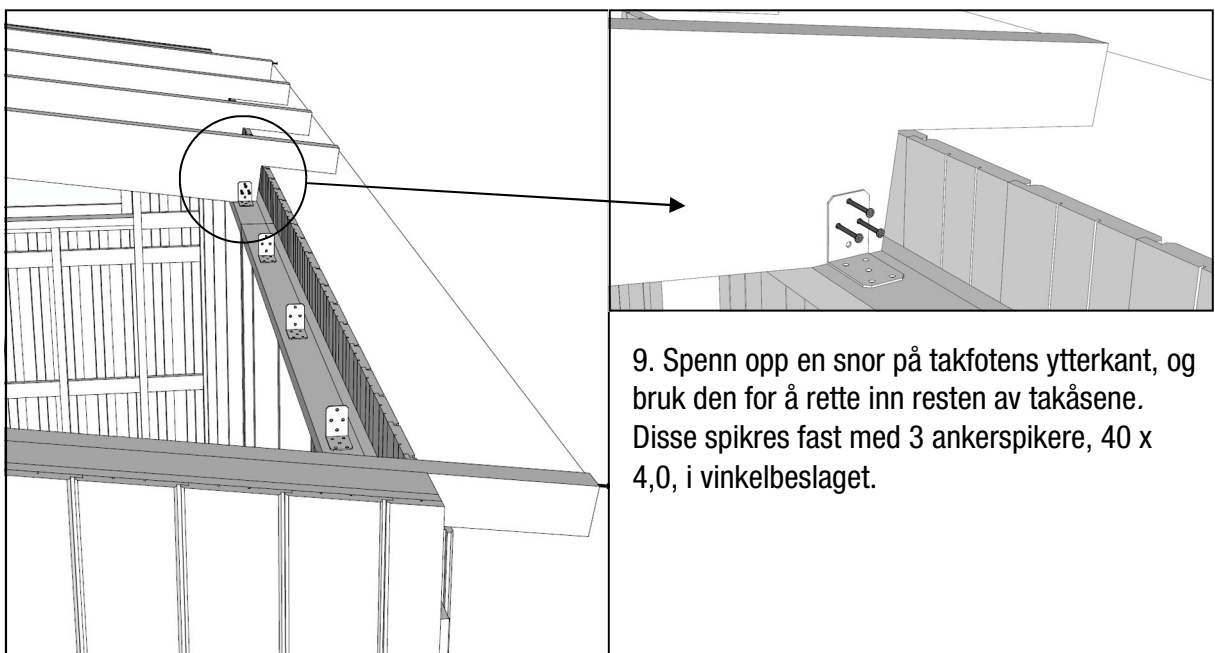


9. Spenn opp en snor på takfotens ytterkant, og bruk den for å rette inn resten av takåsene. Disse spikres fast med 3 ankerspikere, 40 x 4,0, i vinkelbeslaget.



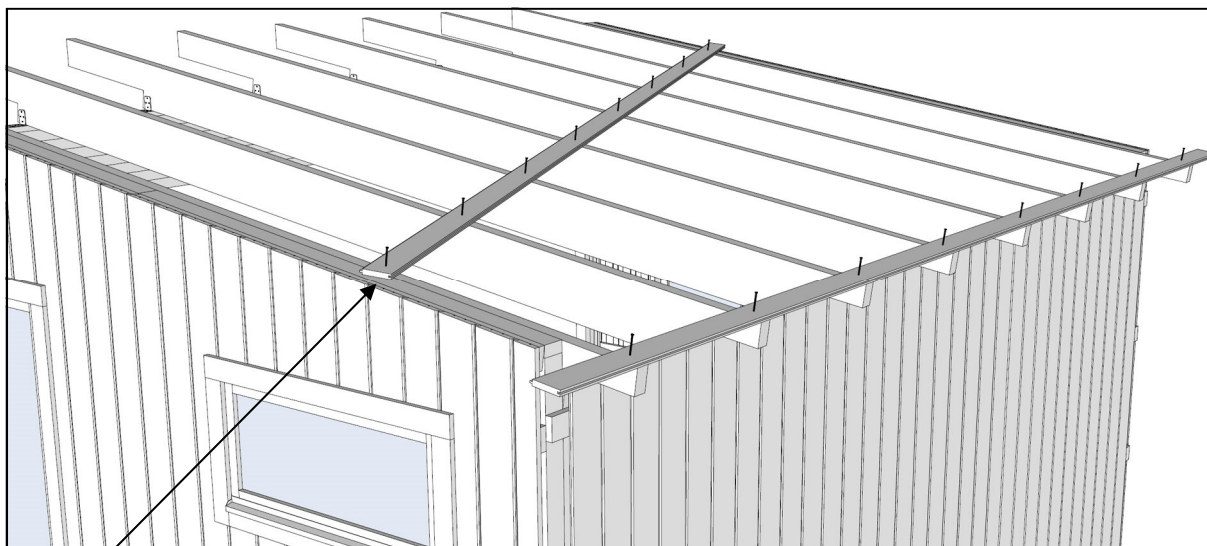


10. Rett opp takstoler. Deretter begynner monteringen av takbord.
 Begynn ved takfotens nedre kant, i flukt med takåsen. Ved behov skal takbordet skjøtes på takåsene. La takbordet stikke minst 200 mm utenfor veggpanelet.
 Spikre fast hvert takbord med 1 spiker, 75 x 2,8, per takås.
 Tilpass siste takbordet i overkanten.
 Avslutt med å rensage takbordene 200 mm utenfor veggpanelet.
 Se **tegning A04 – A05**.

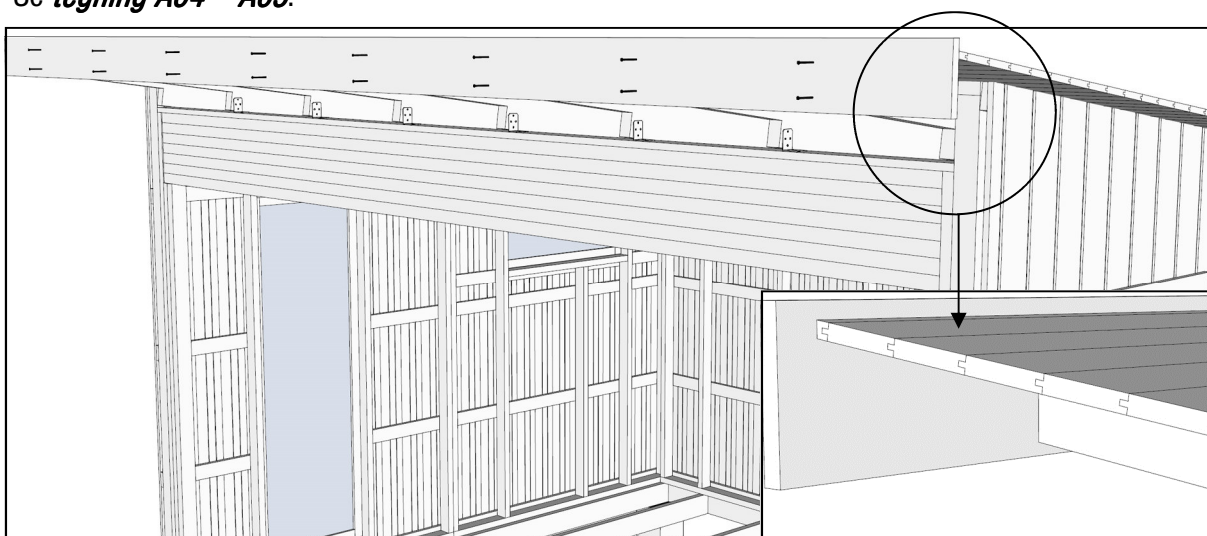


11. Monter vindski front, 21 x 170, støttelekt, 34 x 34, vindskier sider, 21 x 145, og takfotsbord, 21 x 120, i denne rekkefølgen. Bruk 75 x 2,8 spiker til alt unntatt støttelekt, der det skal brukes 60 x 2,3 spiker. Se **tegninger A04 - A05**.

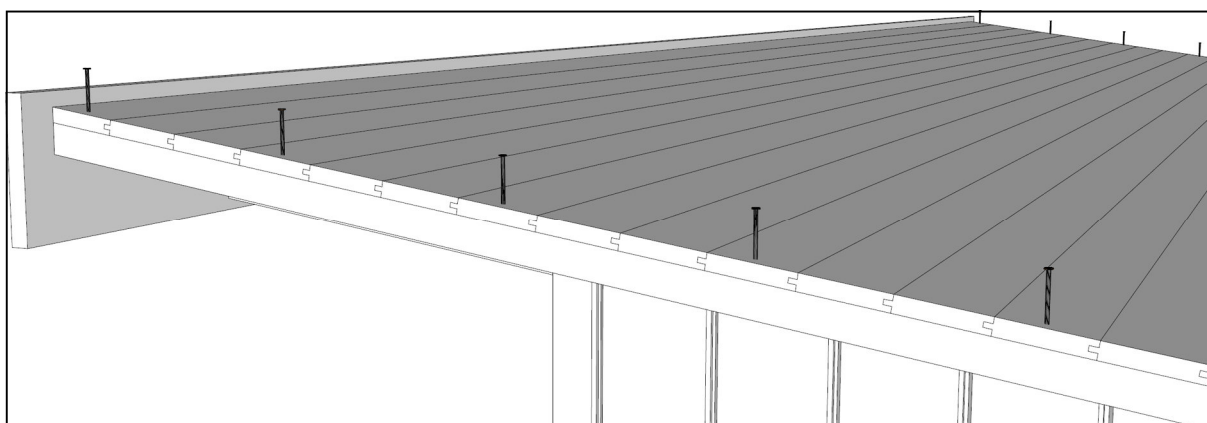


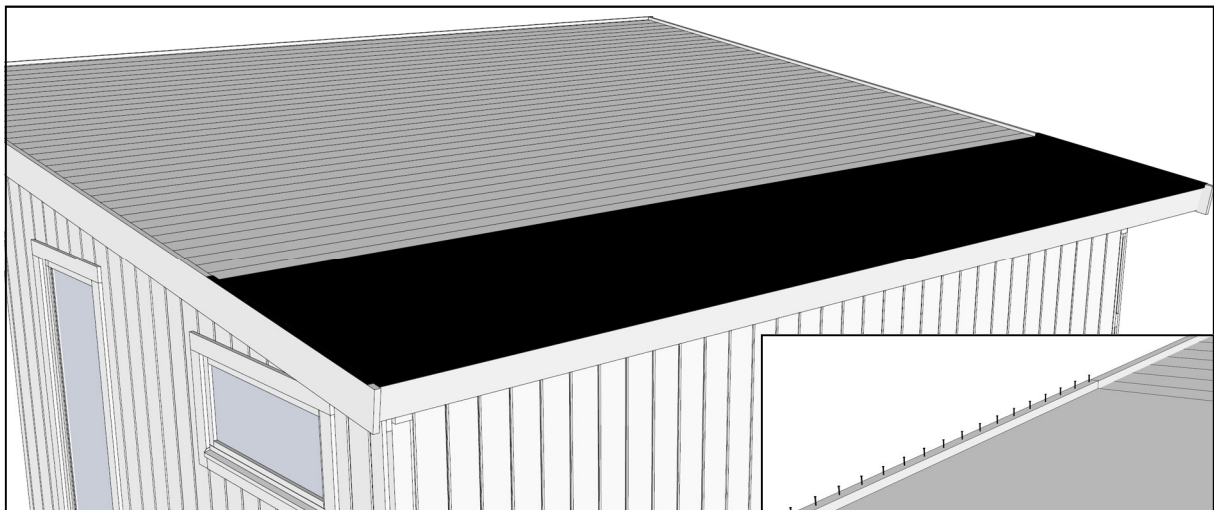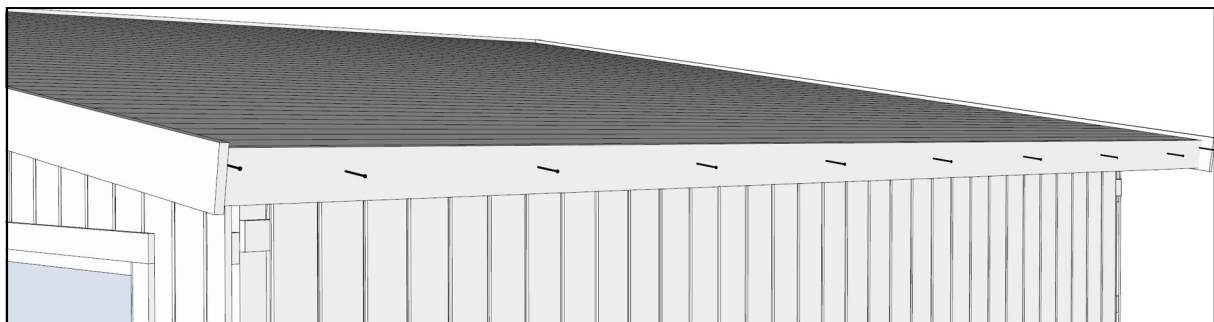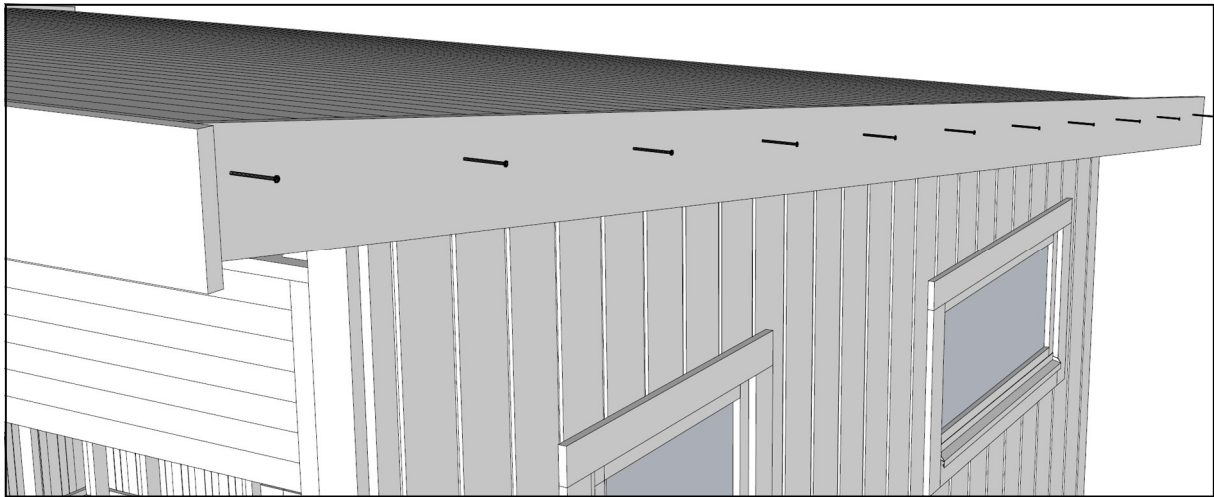


12. Takborden skal umiddelbart dekkes. For eksempel, med underlag papp (ikke inkludert i std. Levering). Monterings eksempler for underlag bord: Monter Fest første bane minst 10 mm utenfor den nedre kanten på takfotsbordet med klisterkant eller ved behov med et godkjent skjøtelim. Fortsett å legge med overlapping på minst 100 mm opp til mønet.


Underlagspappen skal legges med tekstil siden opp. Vi anbefaler at pappen spikres fast med pappspiker, 15 x 2,1, c/c 60 mm, i sikksakk-mønster. Legg pappen oppå vindskiens side, og lengdeskjær på utsiden av vindskien. Tilpass siste pappbane på oversiden av vindskien i front. **OBS!** Underlagspapp er kun en midlertidig takkledning, og en permanent kledning **SKAL** legges umiddelbart. I forbindelse med monteringen av en permanent kledning skal arbeidet avsluttes med montering av vindskielist, takrenner og andre platebeslag.

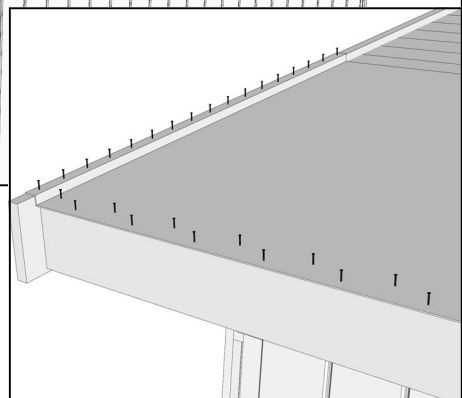

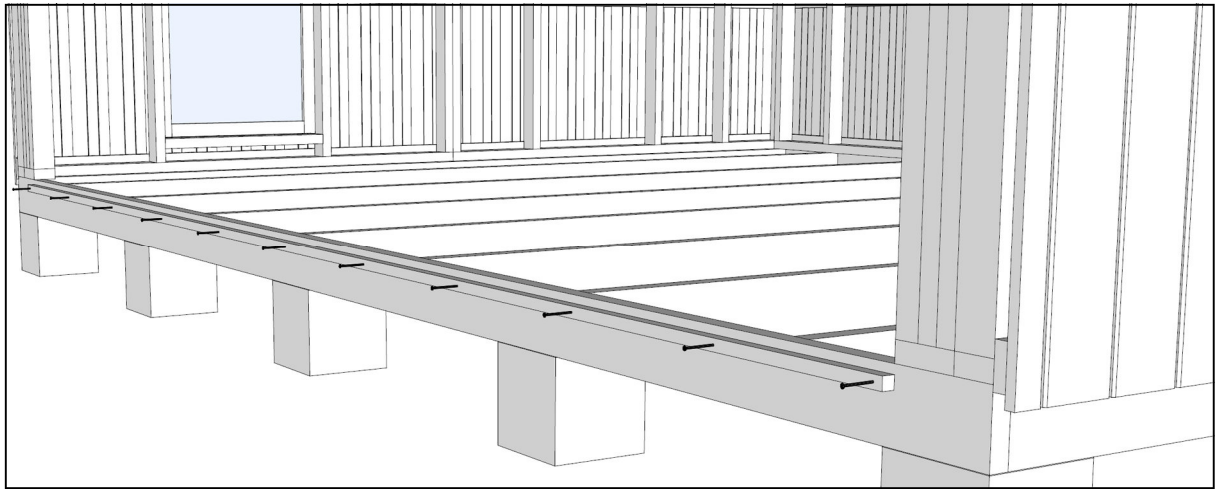


13. Monter sammen karmen til skyvedørpartiet iht. vedlagte monteringsanvisning. Sett sammen de 3 plateprofilene, og tilpass lengden til døråpningen. Merk av hvor støttelekt, 21 x 22, skal sitte, og spikre den fast først. Bruk 60 x 2,3 spiker, se detalj A på *tegning A05*. Legg på plateprofilen, og monter karmen på den, se bildet til høyre. Karmen skrus fast med monteringsskruer, 4,2 x 45, c/c 600 rundt hele. **OBS!** Plateprofilen skrus ikke fast i forveien, men i forbindelse med karmen. Pass på at karmen monteres loddrett og vannrett, kontroller også at diagonalmålene er like. I overkant karm skal det anvendes distanseklusser, der du skrur, slik at karmen ikke bøyes opp.

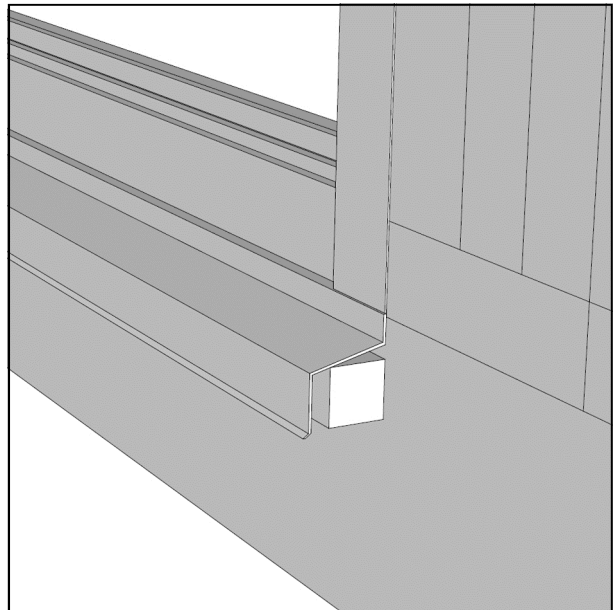

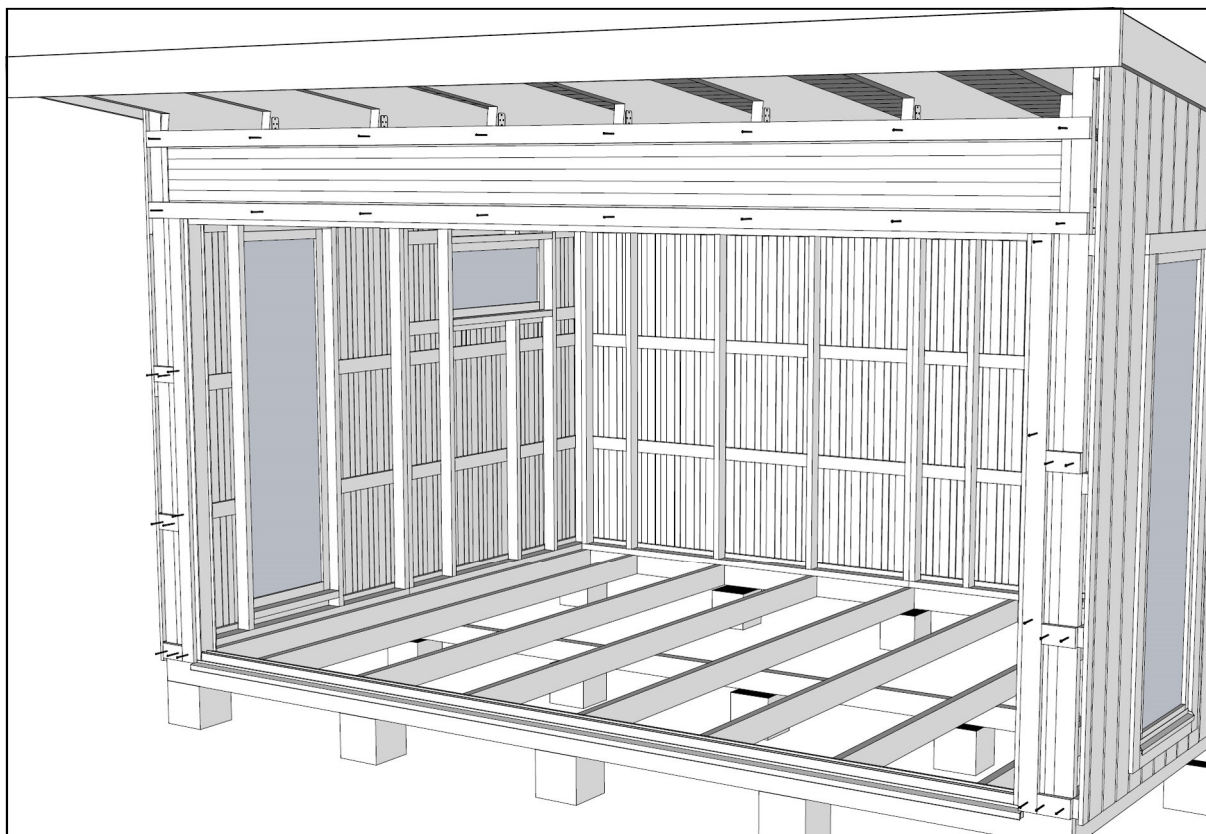


14. Monter spikerlekt, 21 x 70, rundt døråpningen, ca. 10 mm innpå karmen, bruk 75 x 2,8 spiker.
Monter spikerlekten på oversiden av limtrebjelken.
Monter spikerlekten ved siden av døren, ca. c/c 600 mm, sag ut for plateprofilen under skyvedørspartiet.

Se tegning A03, detalj A, og tegning A05, detalj B.

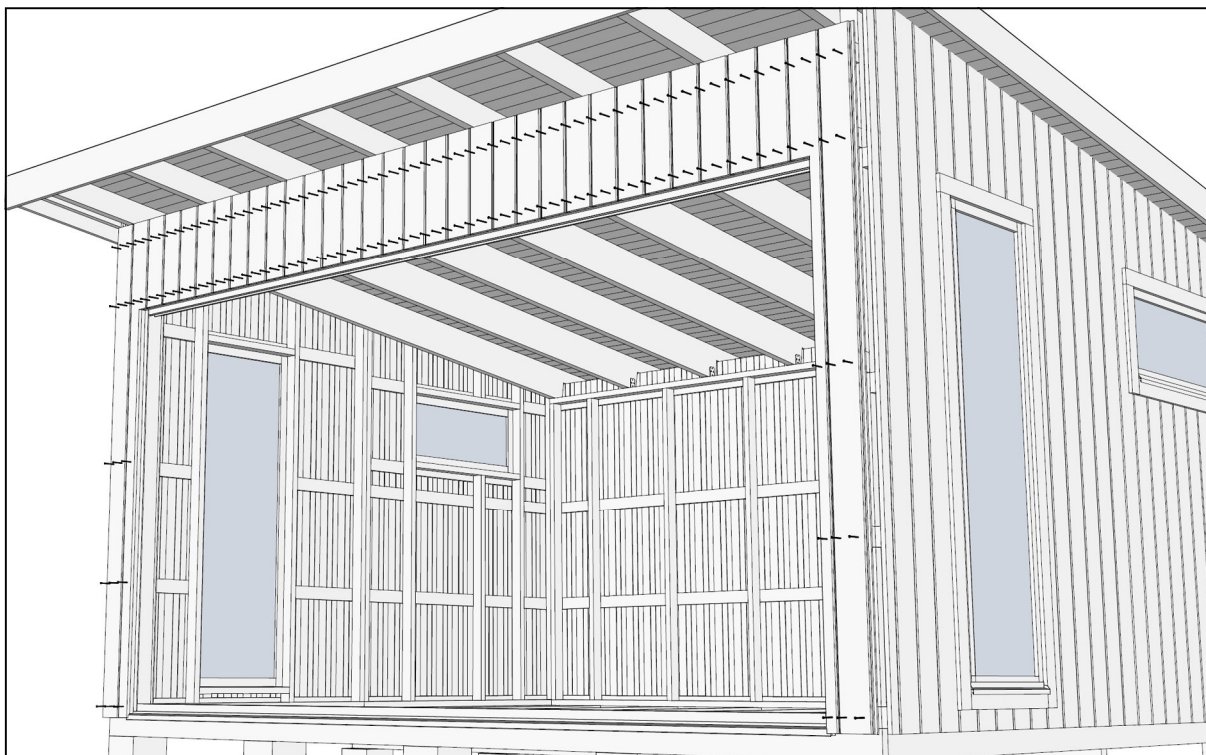


15. Spikre opp funkispanelet. Begynn på høyre side, og tilpass funkispanelet ved skyvedørspartiet.
Bruk 60 x 2,3 spiker.


Se tegning A03, detalj A og tegning A05, detalj B.

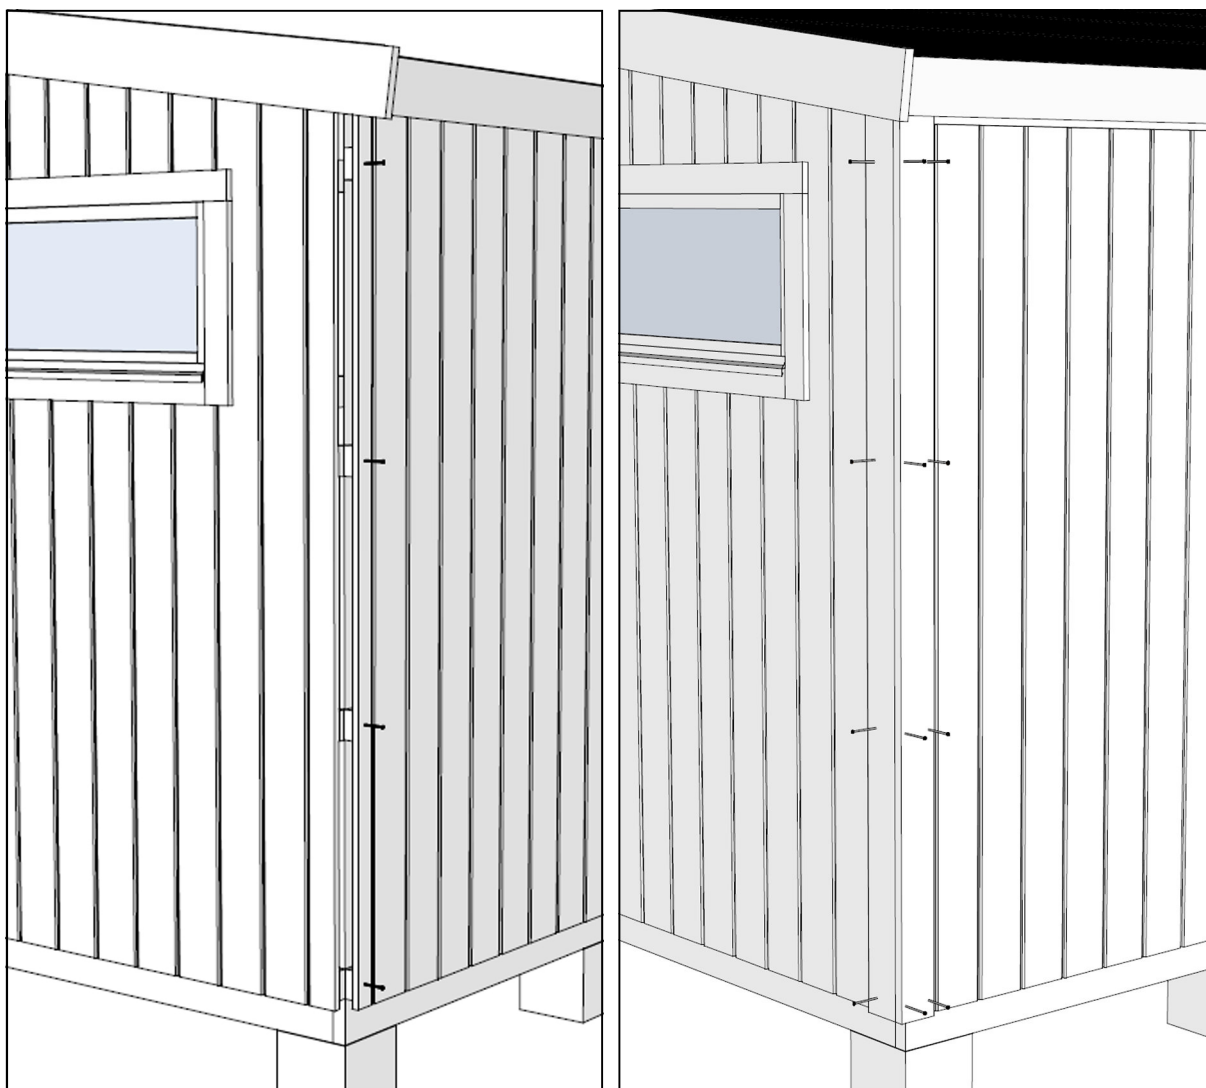

16. Del et funkispanel, og spikre det fast i de bakre hjørnene med 60 x 2,3 spiker. Spikre fast hjørnebord, 21 x 95, i alle fire hjørner, med 75 x 2,8 spiker, se detaljer **tegning A03**.

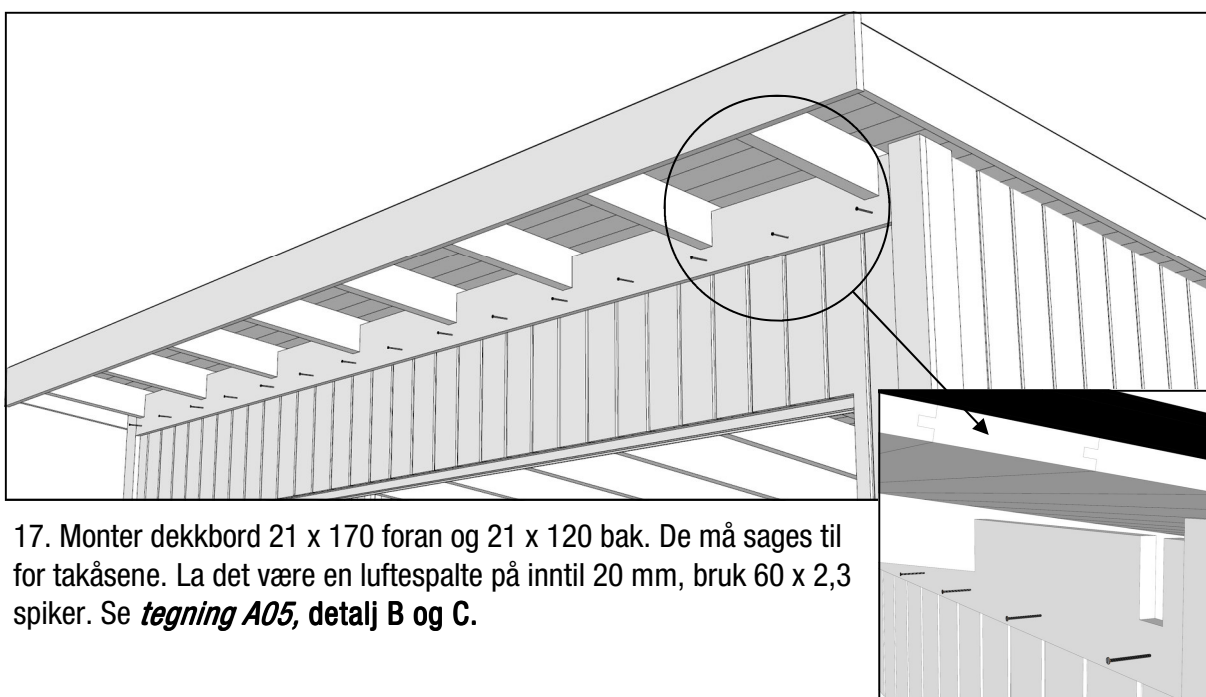

17. Monter dekkbord 21 x 170 foran og 21 x 120 bak. De må sages til for takåsene. La det være en luftespalte på inntil 20 mm, bruk 60 x 2,3 spiker. Se **tegning A05, detalj B og C**.

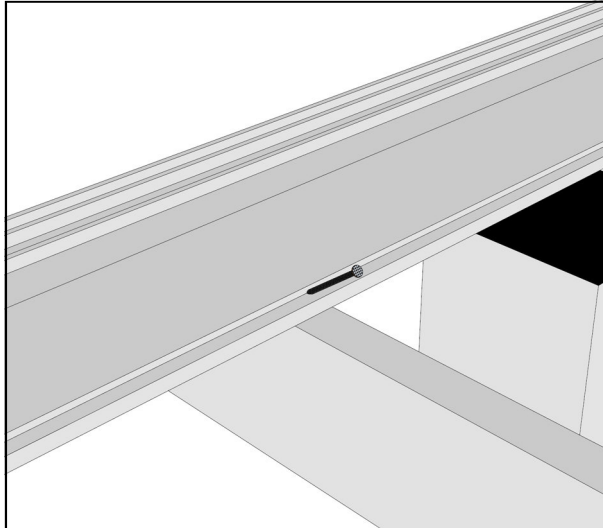

18. Monter gulvbord, spikre usynlig med trådspiker, 60 x 2,3, til gulvbjelkelaget. ^s Bruk spikerdør de siste 5 mm. Se bildet til høyre. Begynn om mulig på siden med skyvedørspartiet. Siste bordet deles for å passe inn. Se **tegning A05**. Gulvtrevirket er kun et underlagsgulv, og det kan forekomme kvistutslag, sprekker osv.

19. Fullfør monteringen av skyvedørspartiet iht. vedlagte monteringsanvisning, og løft på plass glasspartiene.

20. Nå gjenstår det bare å male. Følg vår maleanvisning, eller rådfør deg med en fargehandel .


Nå er ROSENLUND 15 N ferdig.

Lykke til!


JABO Wood Products AB

Monteringsanvisning for Rosenlunds skyvedørparti 2010B (Norska 2014-01-29)


1. Karmmontering

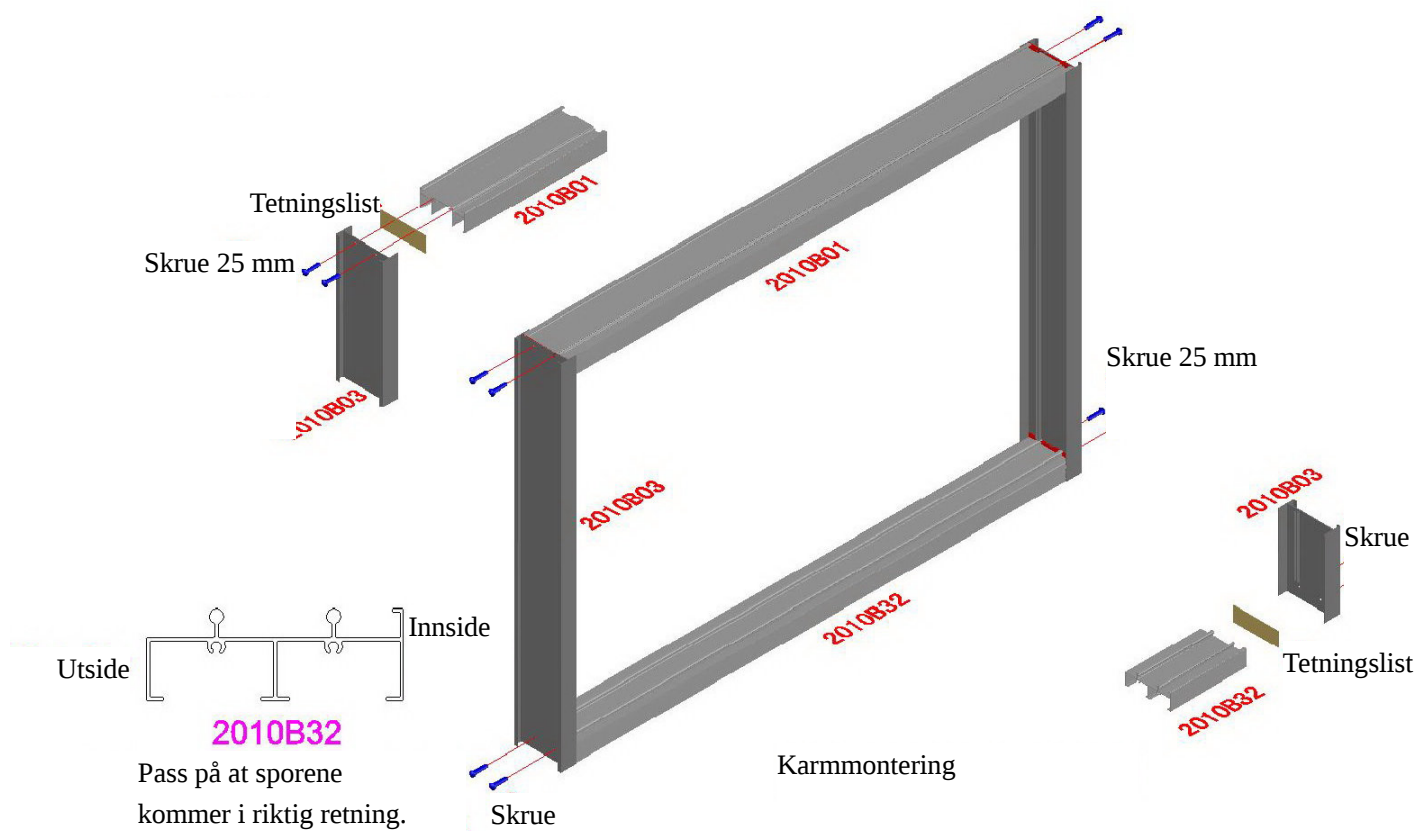


A. Detalj hjørnetegning

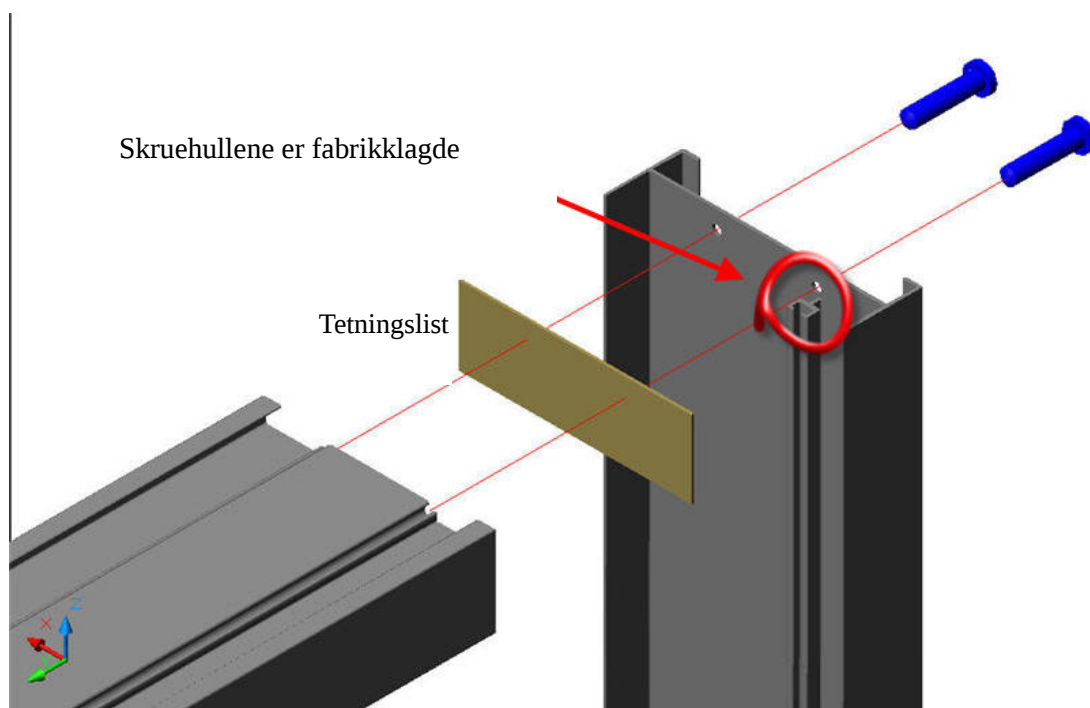



B.

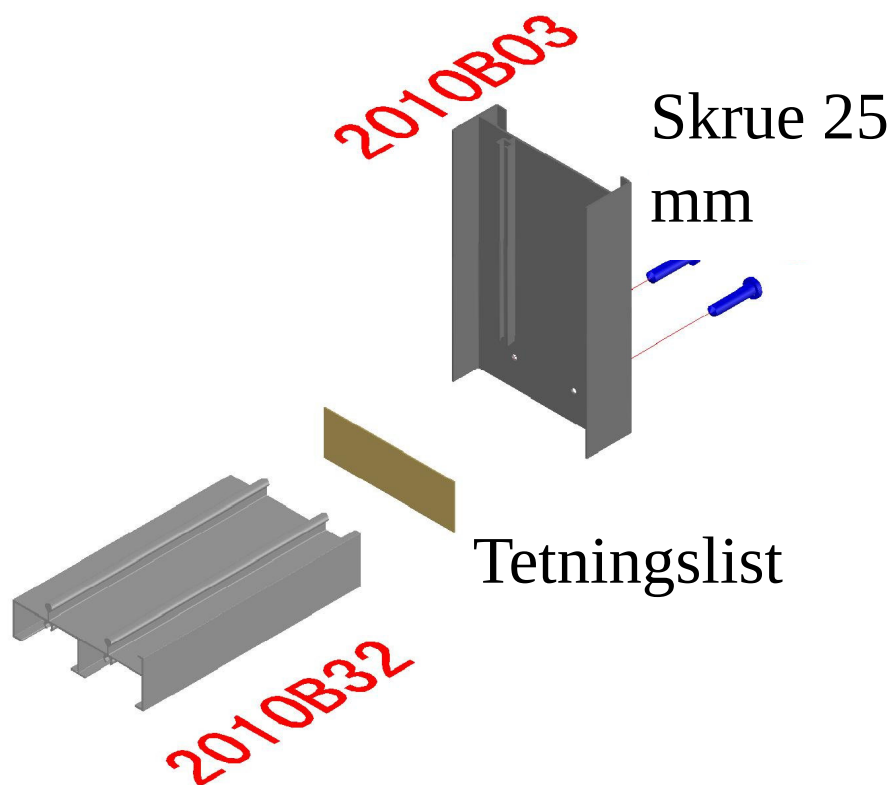

2. Monteringstegning for karm og vegg

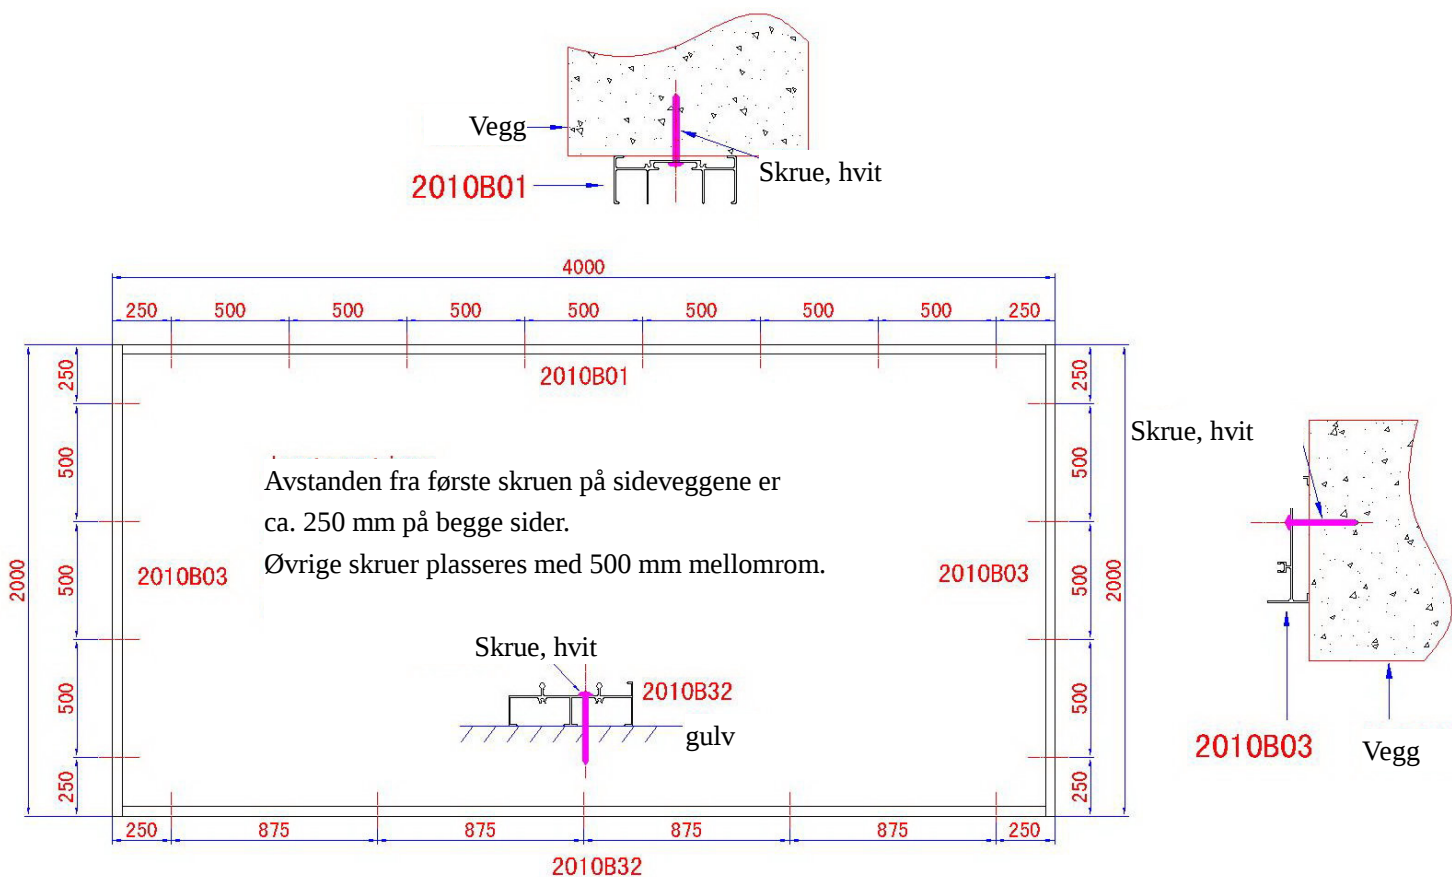


3. Montering av skyveparti

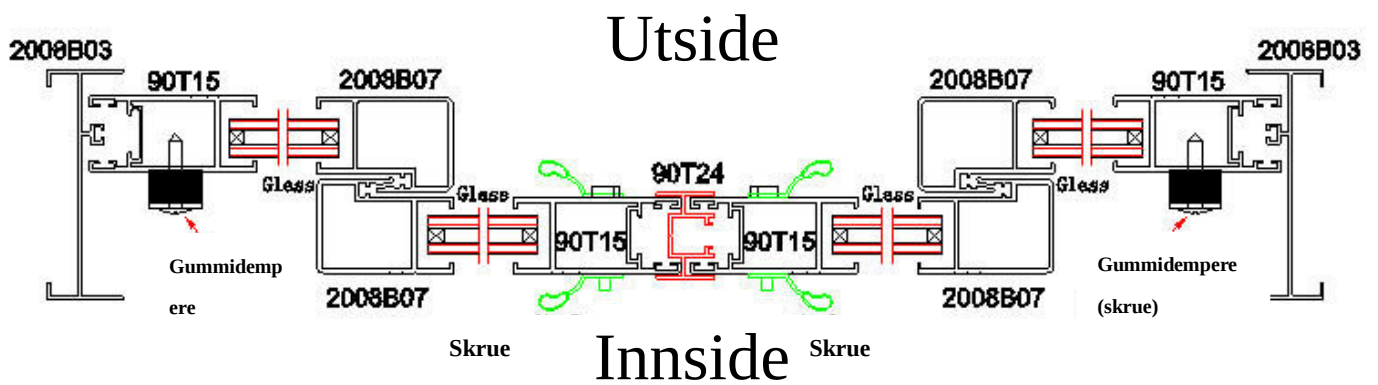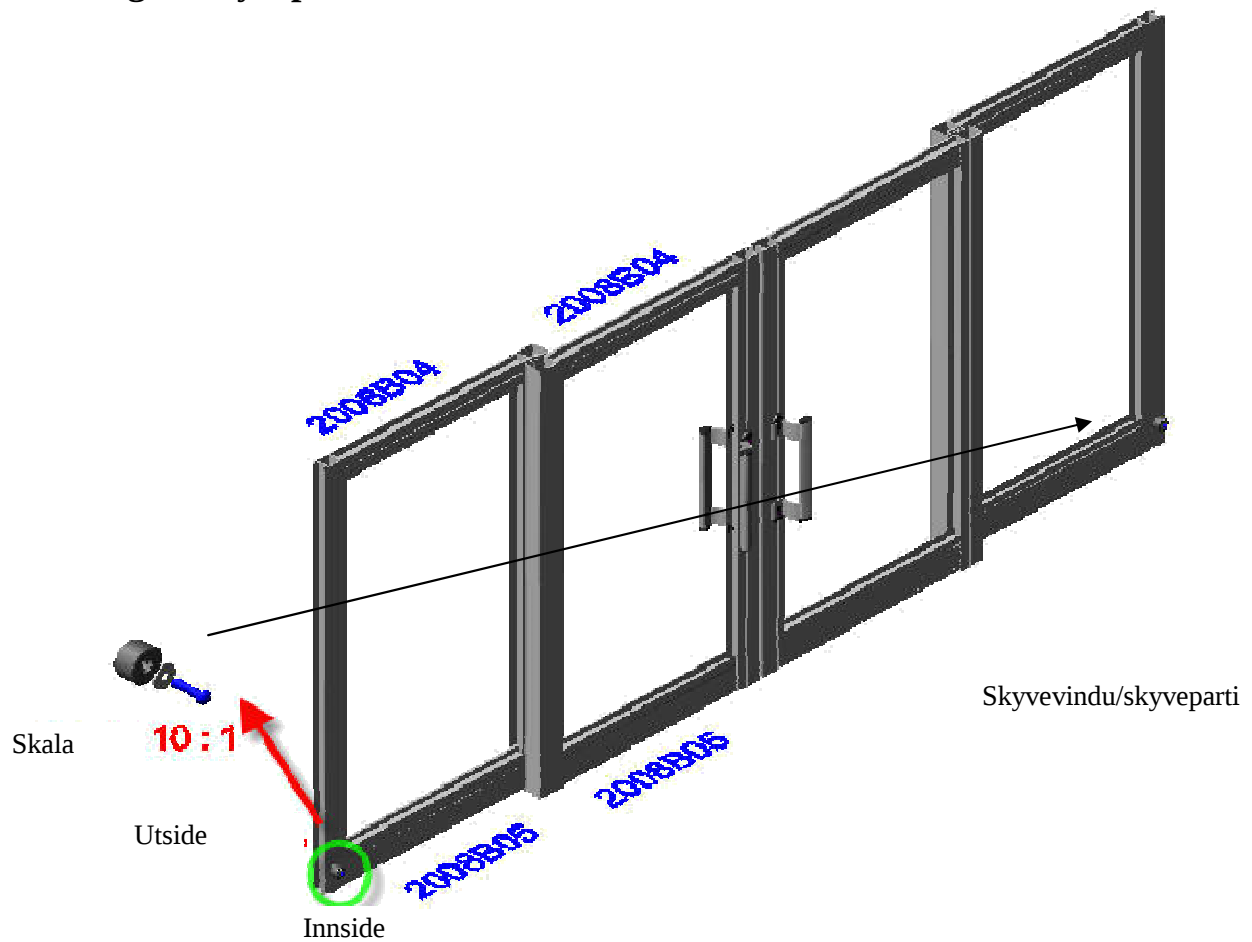


Skruehullene for gummidemperne ferdigbores i produksjonen.
Monter i henhold til tegningen over.


4. Montering av lås

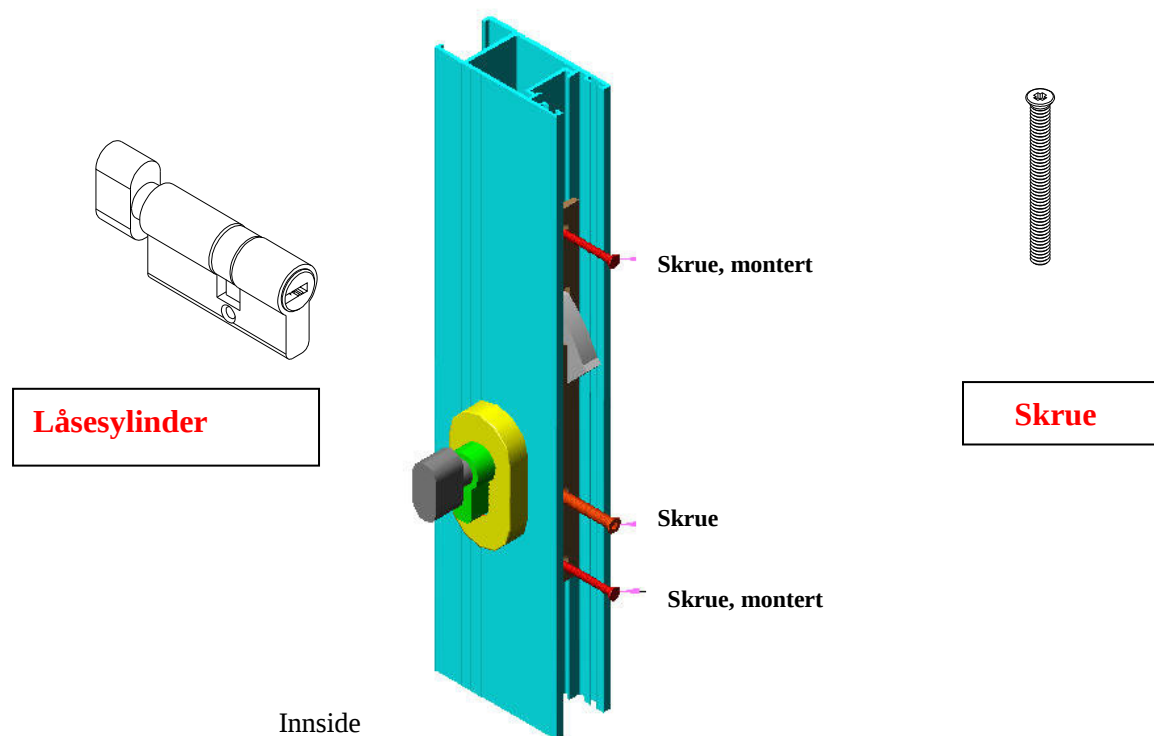


(Instruksjon: Monter låsesylinderen i de eksisterende dekkbrikkene.
Fest sylindere med skrue i siden på partiet. Se bildet over.
Åpne og lukk noen ganger for å sjekke at alt er riktig montert.)

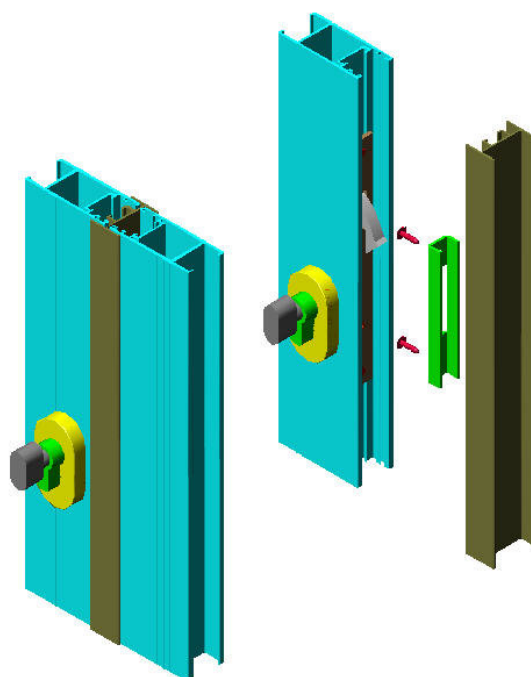


5.A. Montering av håndtak

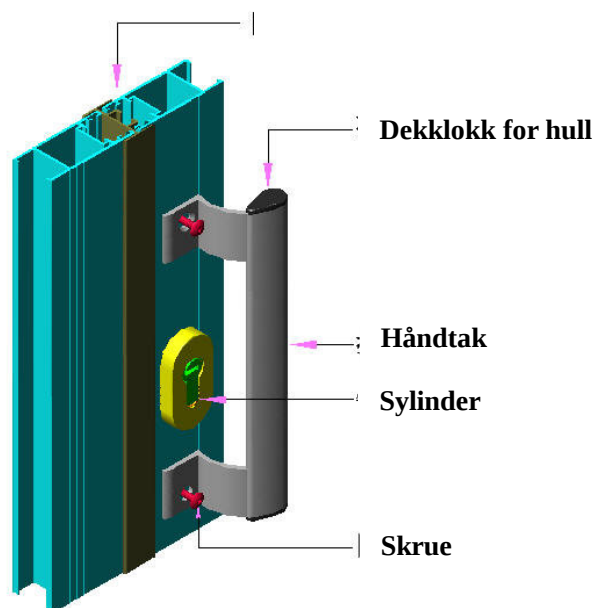

B. Monter dekkbrikke over skruenhull

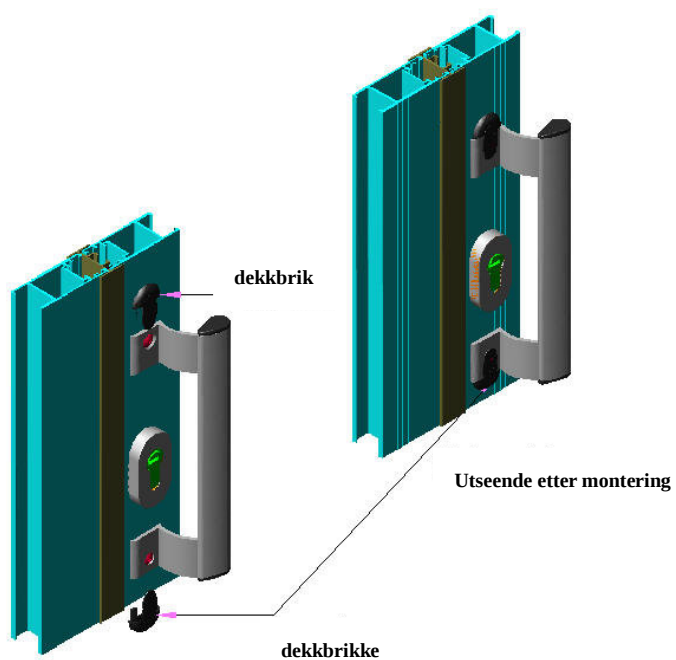

C. Bilde av ferdigmontert lås

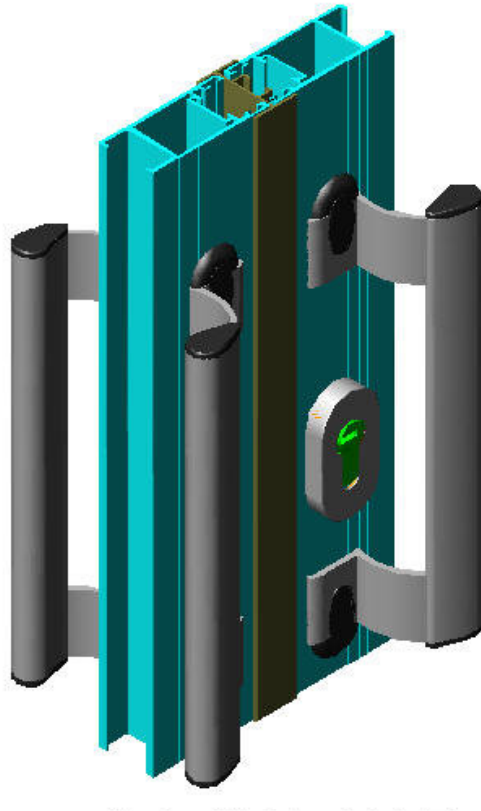

FÖRESKRIFTER

TAK: RÅSPONT 17 MM
TAKÅSAR 43x195 c600





VÄGGAR: 14x120 FUNKISPANEL
21x70 SPIKREGLAR
VINDPAPP
REGLASTOMME 34x70
SKJUTGLASPARTI 40x20

DÖRR
FÖNSTER 9x4, 2 st
ÖPPNINGSBARA
2 st 6x18 FASTA

GOLV: BÄRLINA 47x100
BJÄLKLÄG 34X120
GOLVTRÄ 21 mm


ÖVRIGT: LIMTRÄBALK ÖVER GLASPARTI
TAKFOTSBRÄDOR
VINDSKIVOR
KNUTFODER
SPIK FÖR MONTERING

BYGGNADSAREA (BYA): 14,9 m²

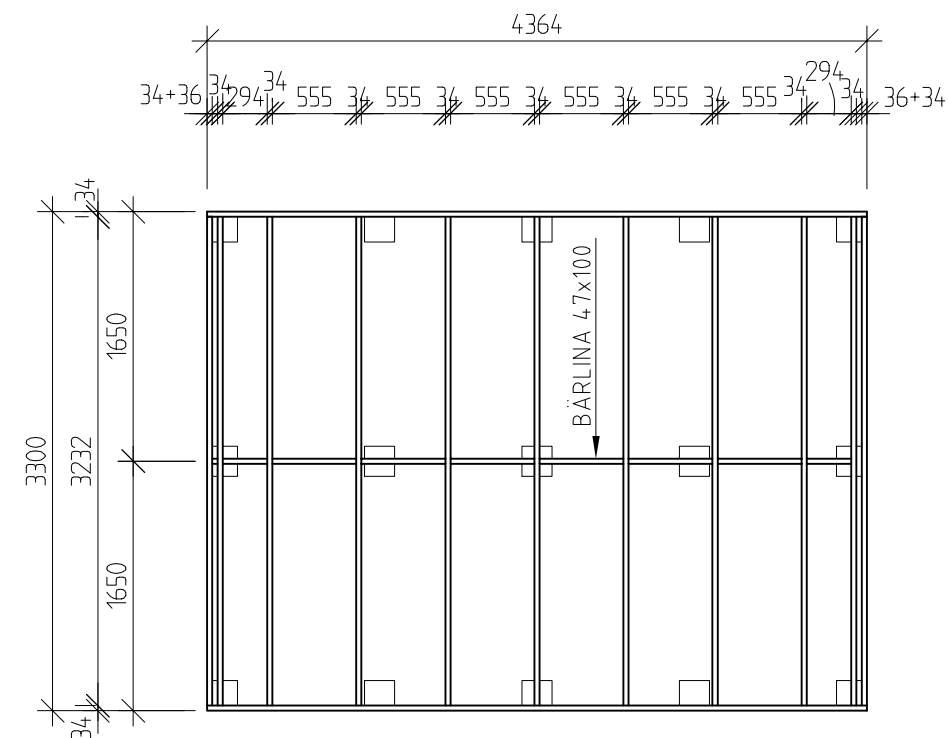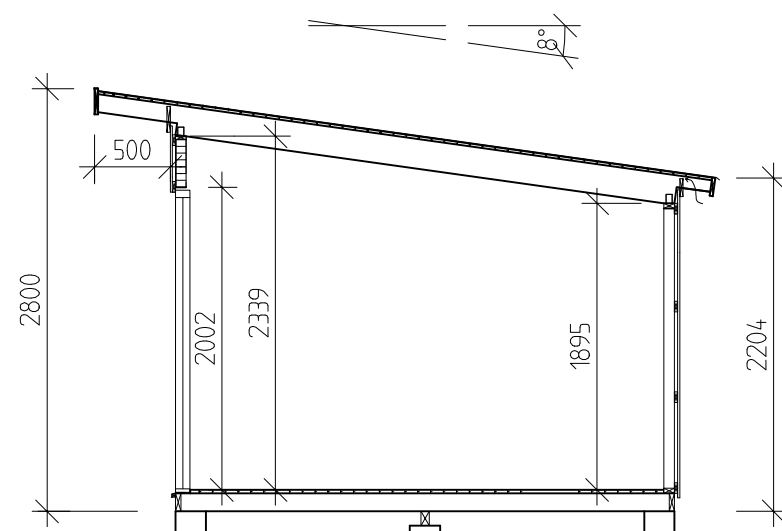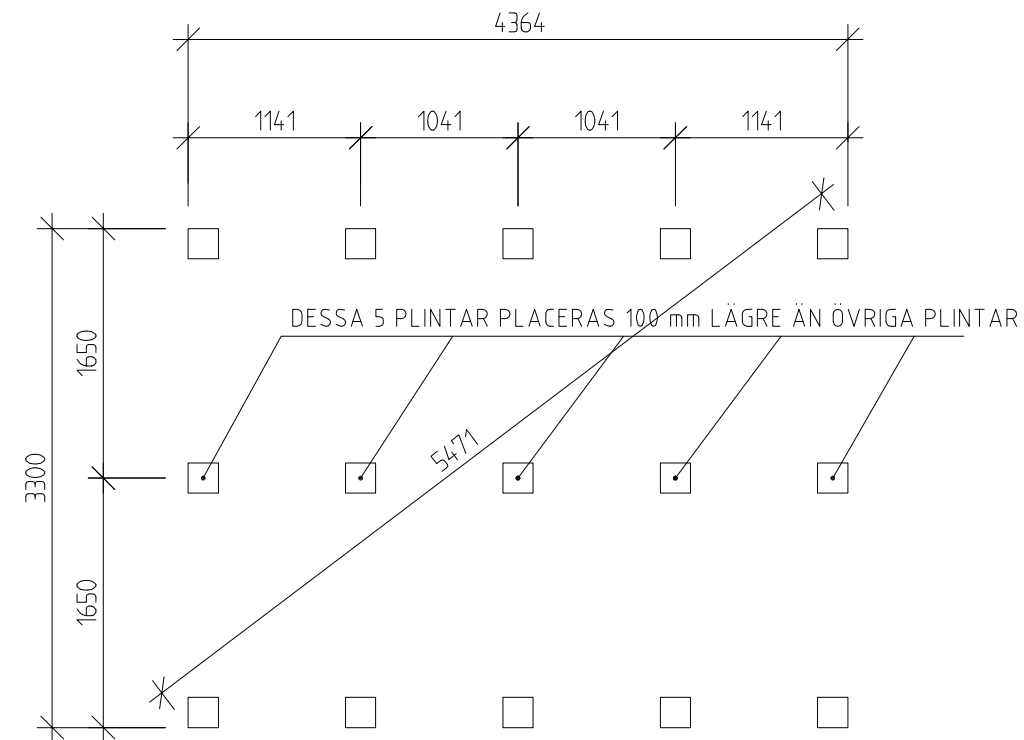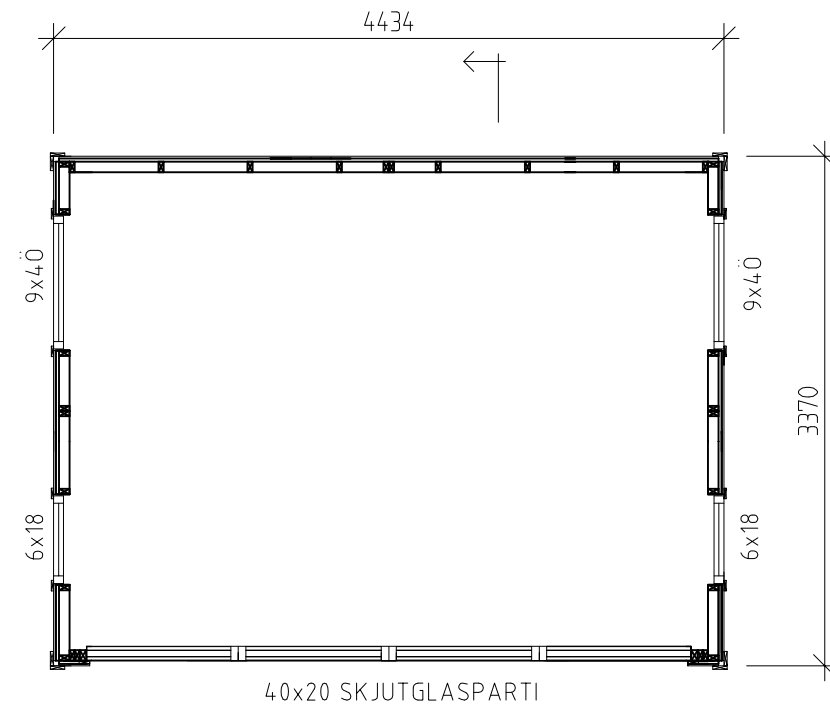


BJÄLKLAGSPLAN
SE ÄVEN RITNING A 06


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSEER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
JABO				
Gislavedsvägen 18, 514 93 ÅMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00				
UPPDRAGS NR 1156	RITAD./KONSTR AV J.A.		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2014-09-03	ANSVARIG			
ROSENLUND 15 N (Art.nr 5060)				
PLANER, SEKTION				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A01			
				I BET

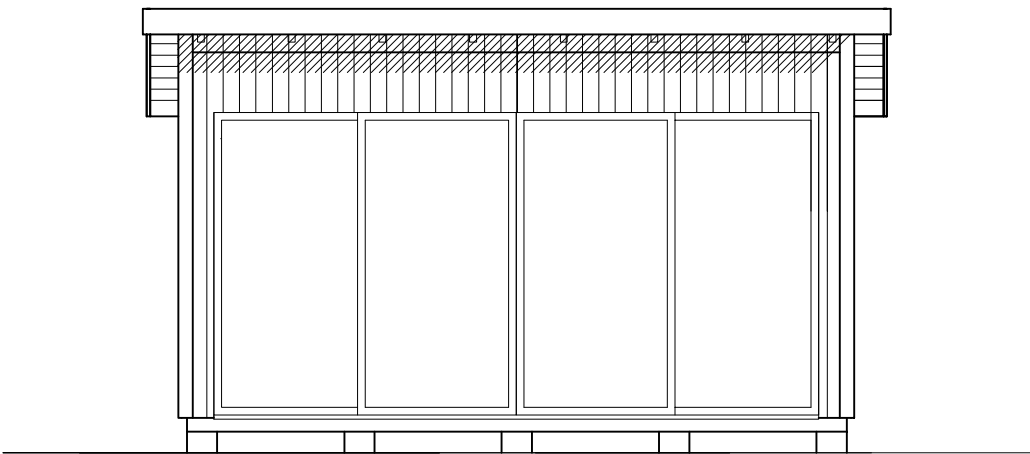


FASAD FRAMSIDA

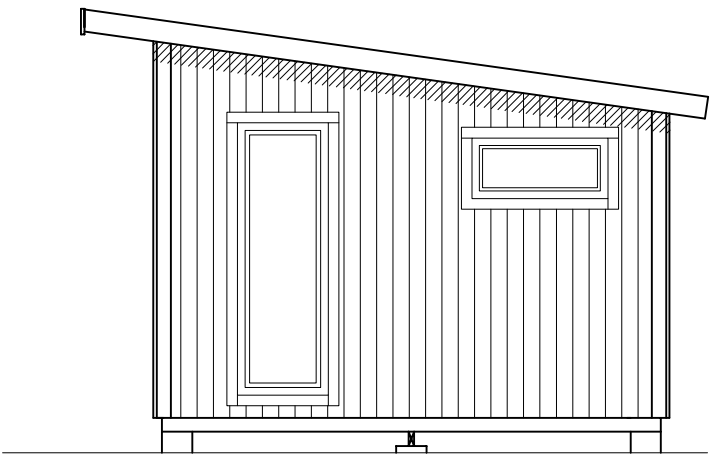

GAVELFASAD








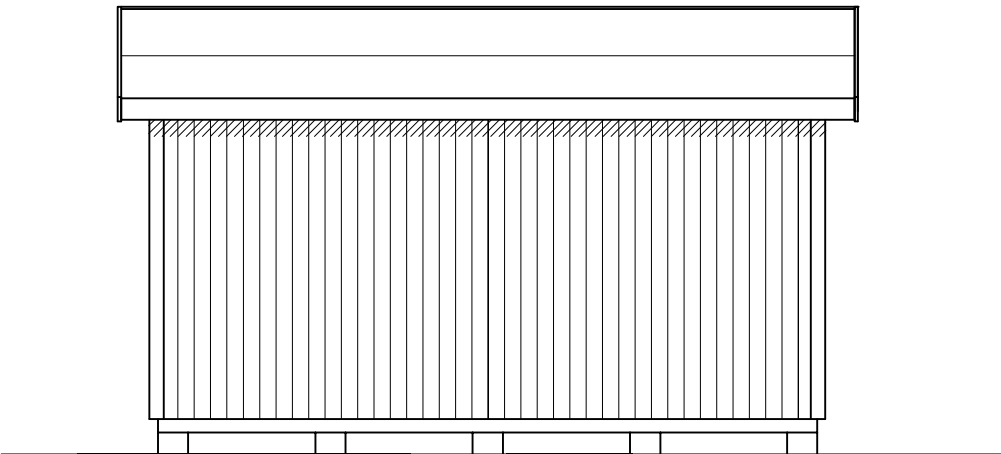


FASAD BAKSIDA

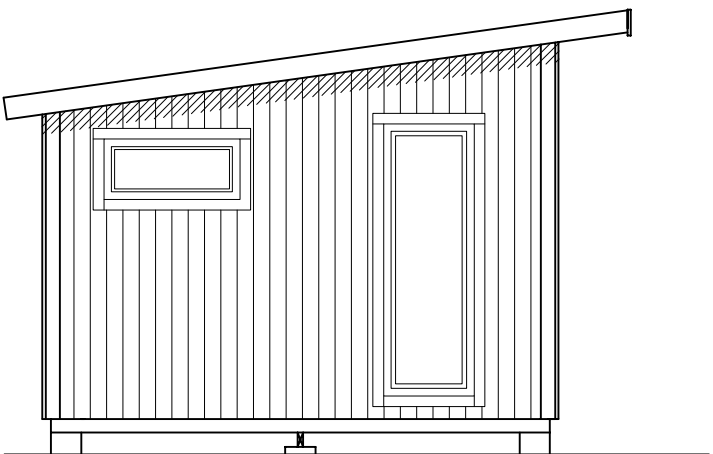


GAVELFASAD


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
JABO Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR	1156	RITAD./KONSTR AV	J.A.	UPPDRAGSLEDARE
DATUM	2014-09-03	ANSVARIG		
ROSENLUND 15 N (Art.nr 5060)				
FASADER				
SKALA	A1/A3	NUMMER	A02	BET
1:50, A3				

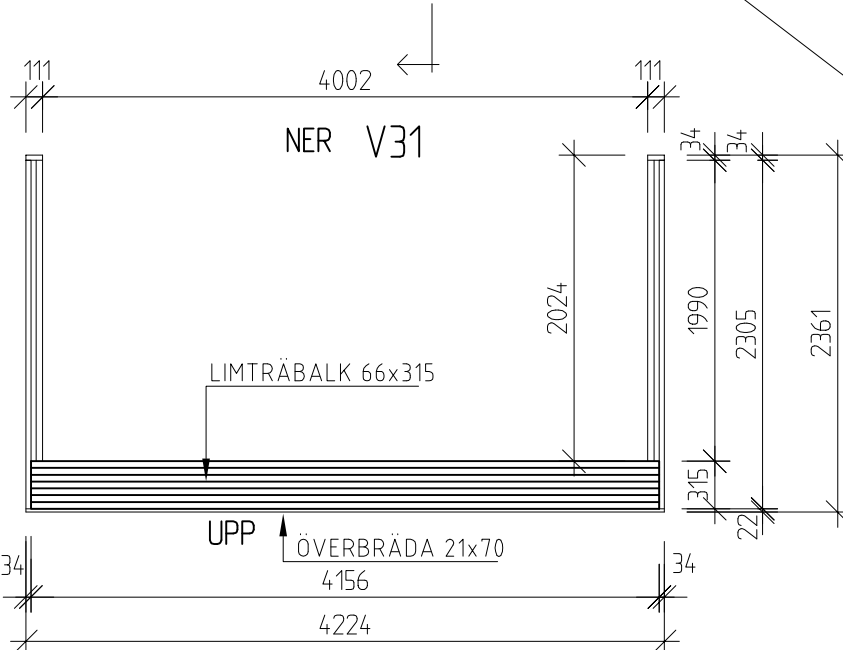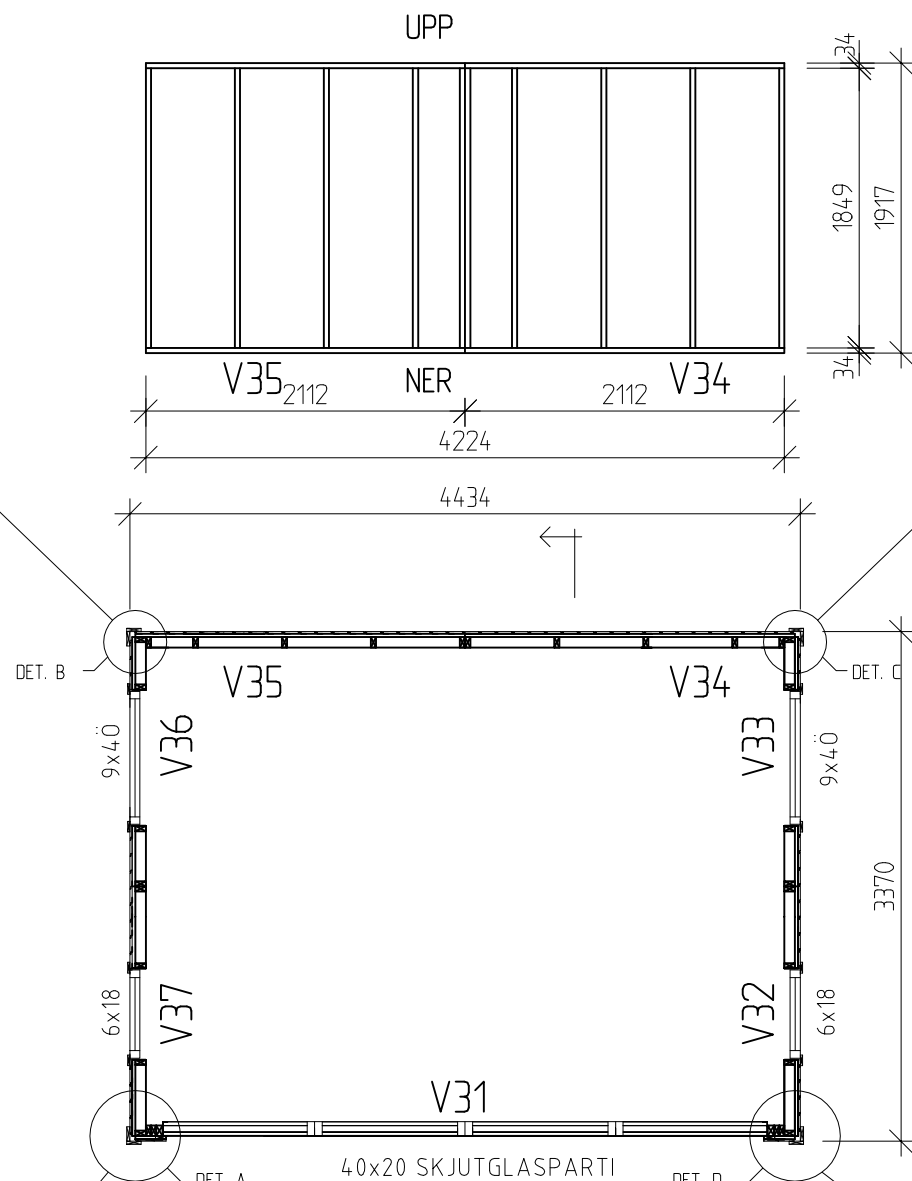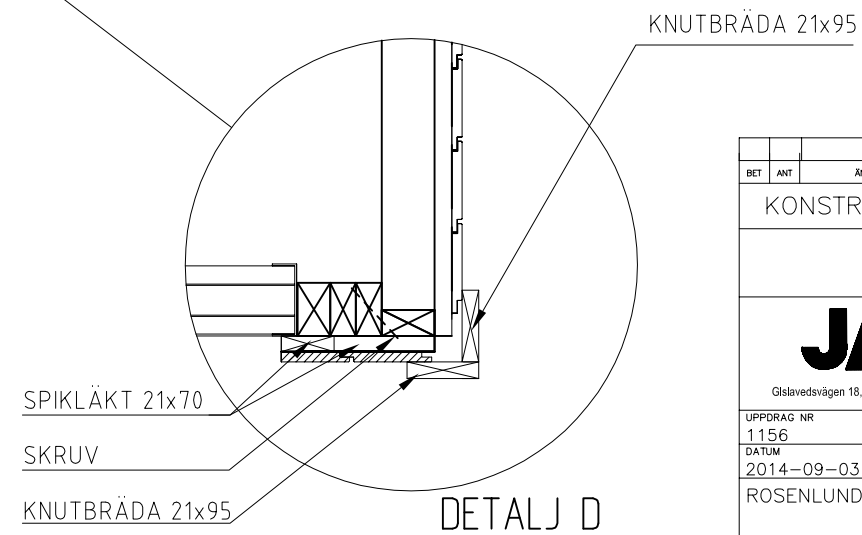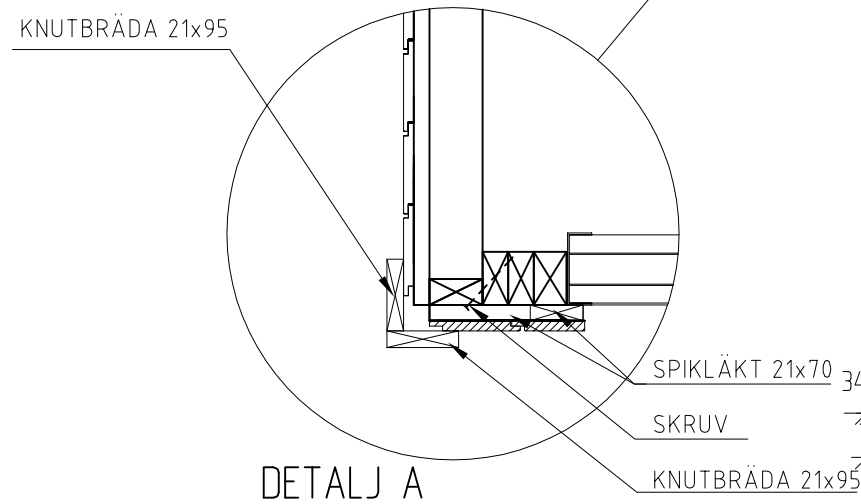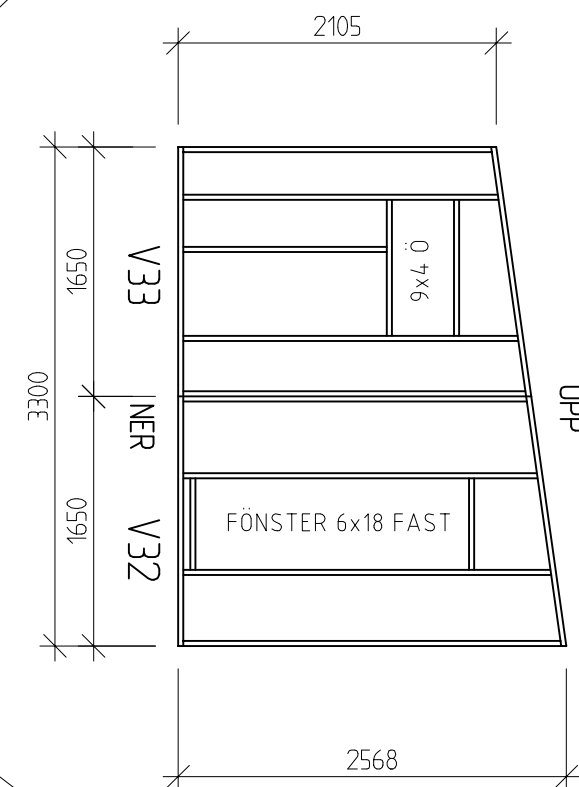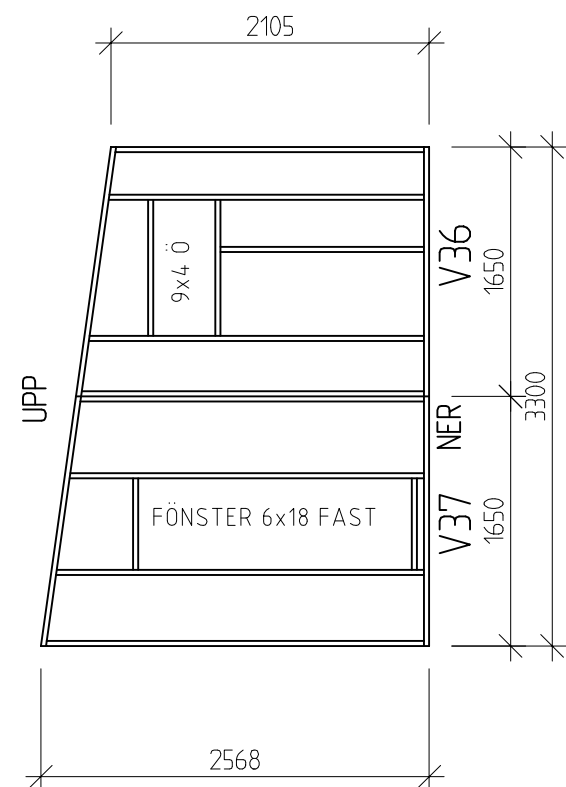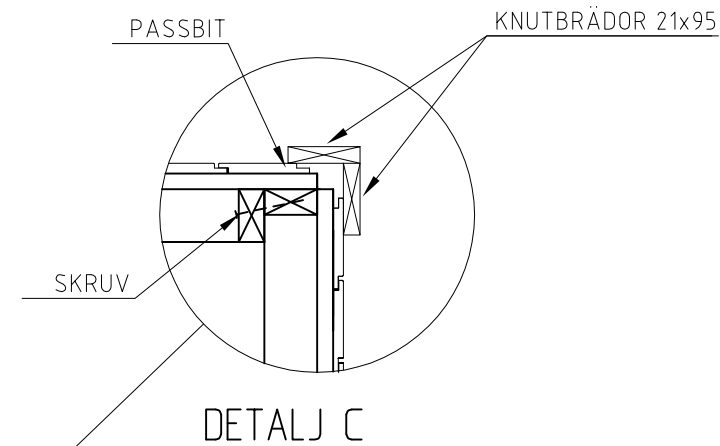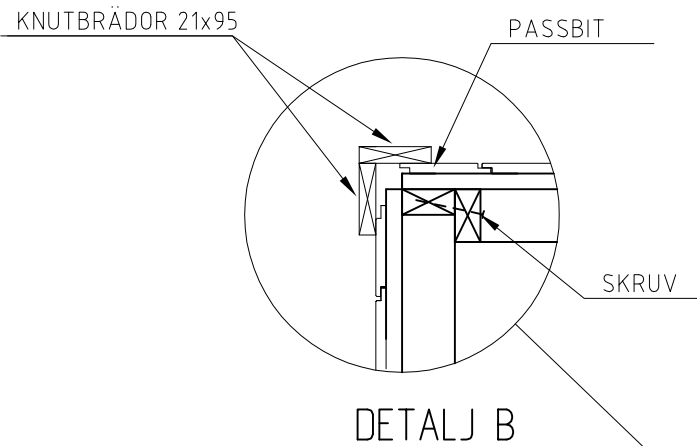

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
JABO				
Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR 1156	RITAD/KONSTR AV J.A		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2014-09-03	ANSVARIG			
ROSEN LUND 15 N (Art.nr 5060)				
VÄGGPLAN				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A03			I BET

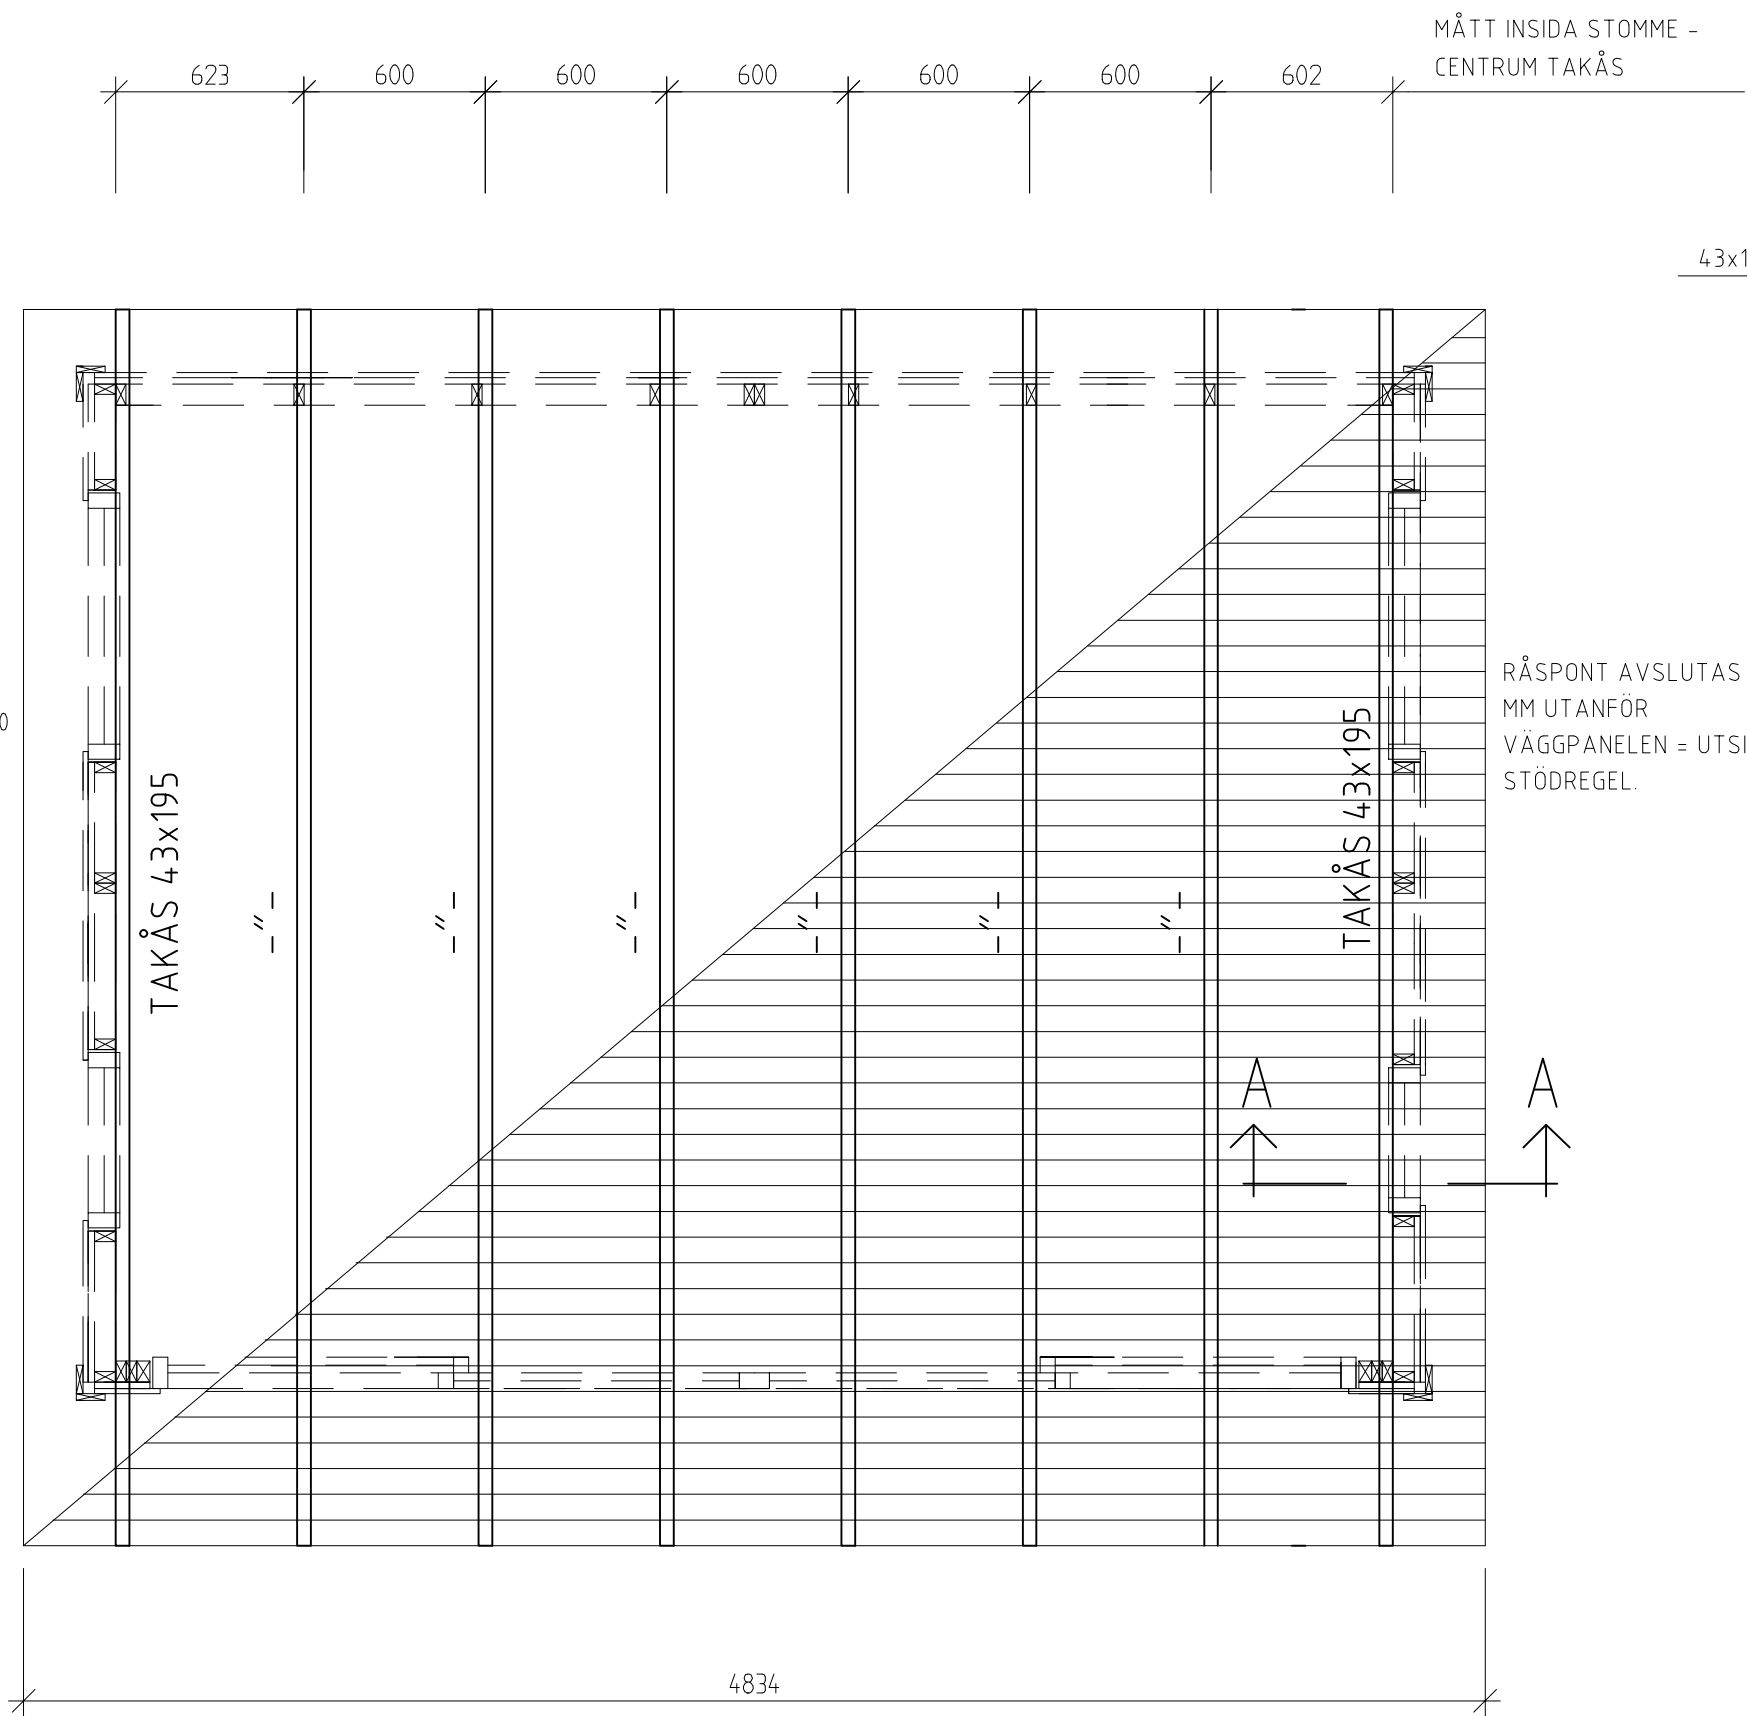


RÅSPONT AVSLUTAS 200
MM UTANFÖR
VÄGGPANELEN = UTSIDA
STÖDREGEL.

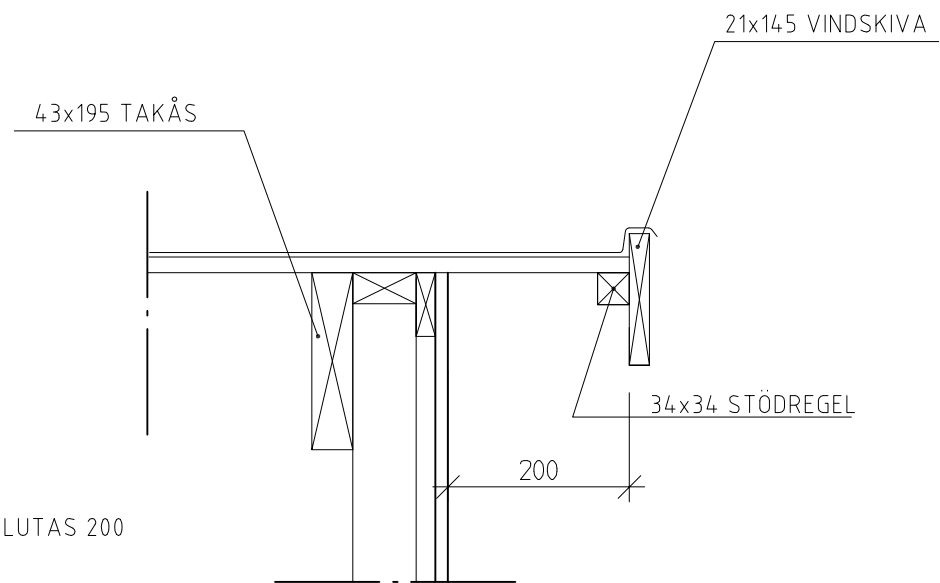


DETALJ A-A
TAKUTSPRÅNG
KORTSIDOR

TAKPLAN / RÅSPONTPLAN


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
JABO Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNÄRP Tel. 0325-66 17 00				
UPPDRAG NR 1156	RITAD/KONSTR AV J.A		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2014-09-03	ANSVARIG			
ROSENLUND 15 N (Art.nr 5060)				
TAKPLAN				
SKALA A1/A3 A3=1:25	NUMMER A04		I BET	

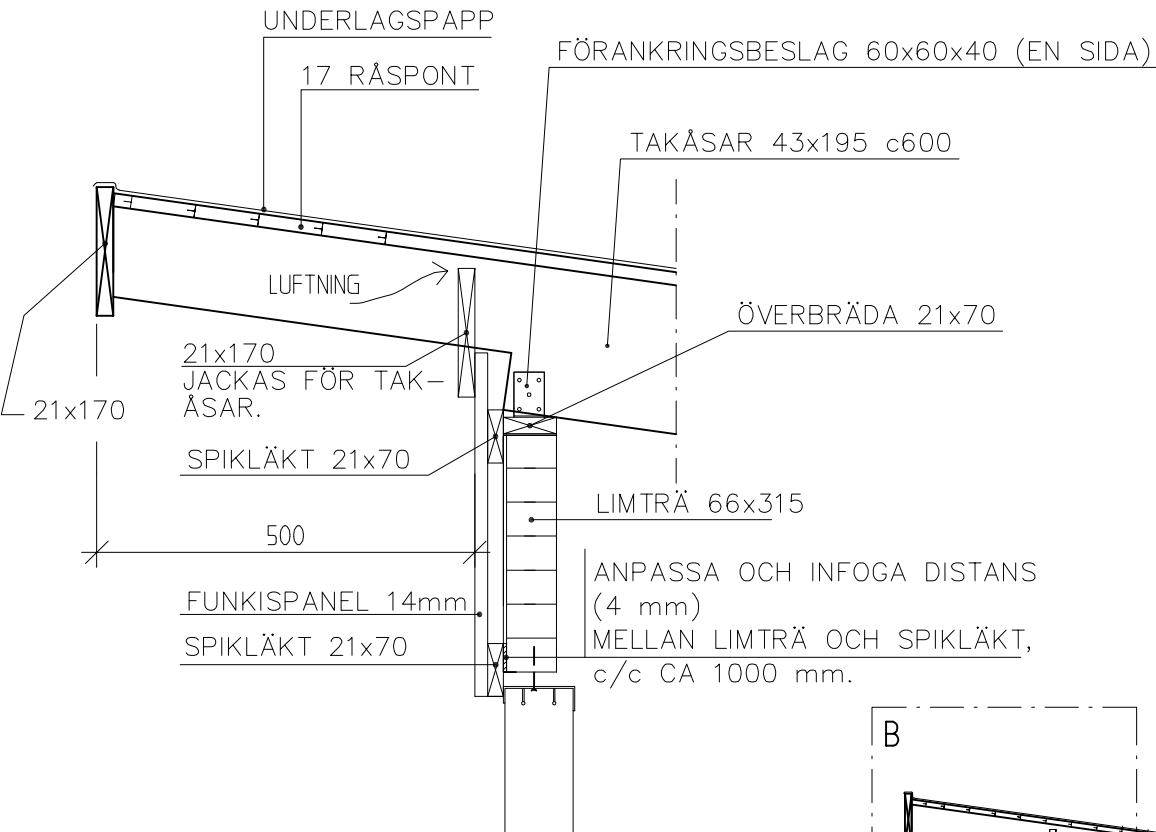

DETALJ B

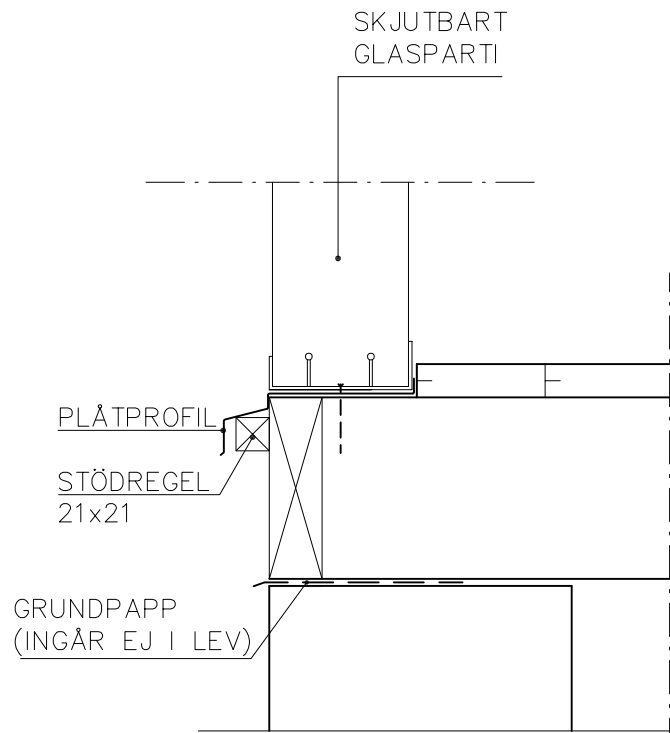


DETALJ A

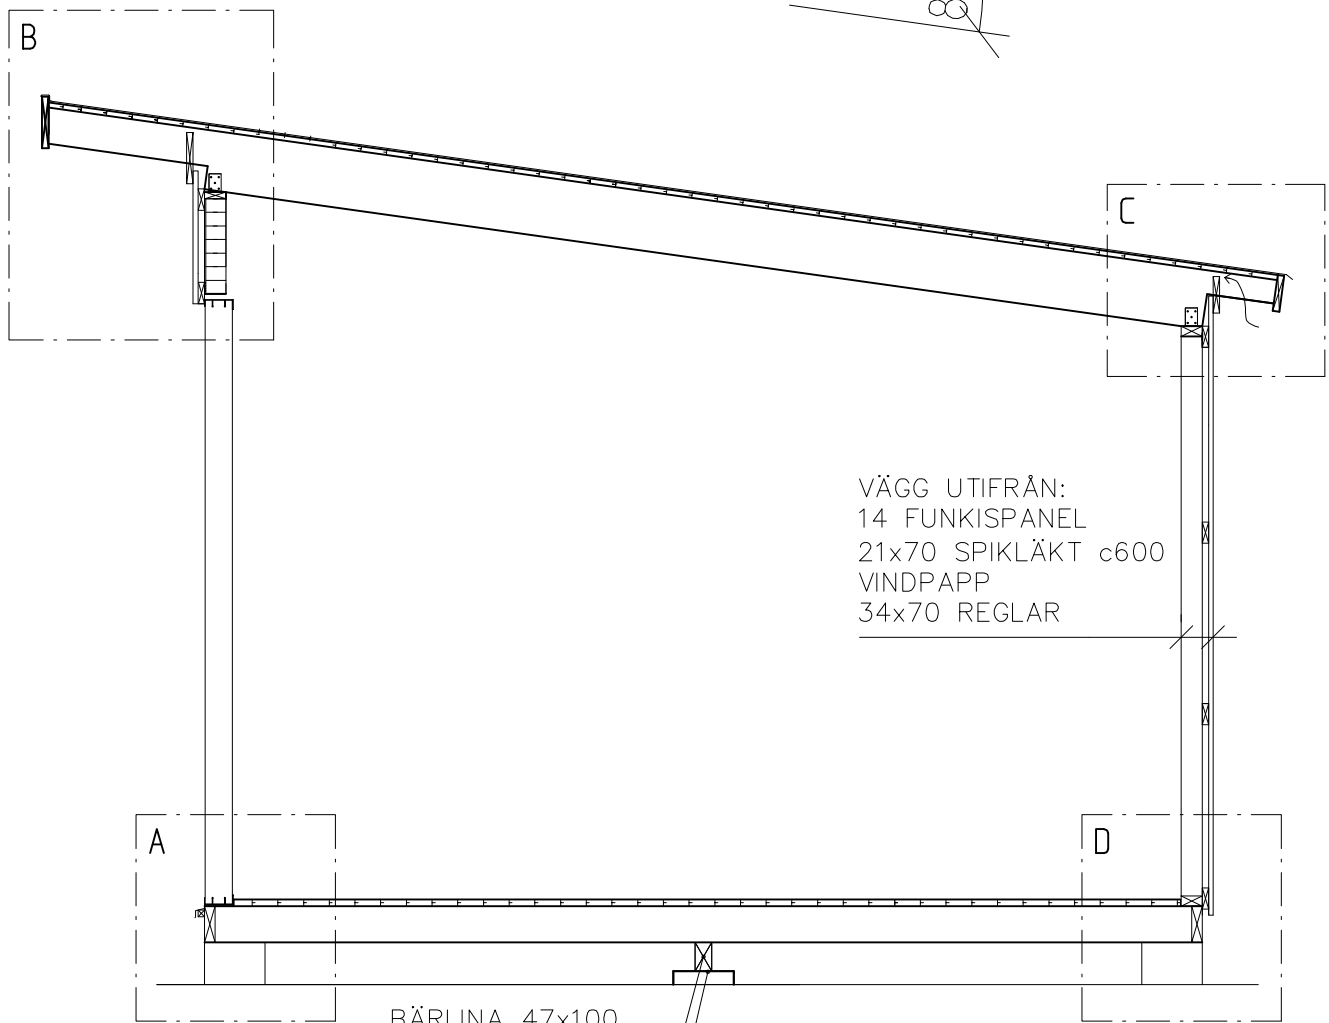


SEKTION

FÖRANKRINGSBESLAG 60x60x40
EN SIDA

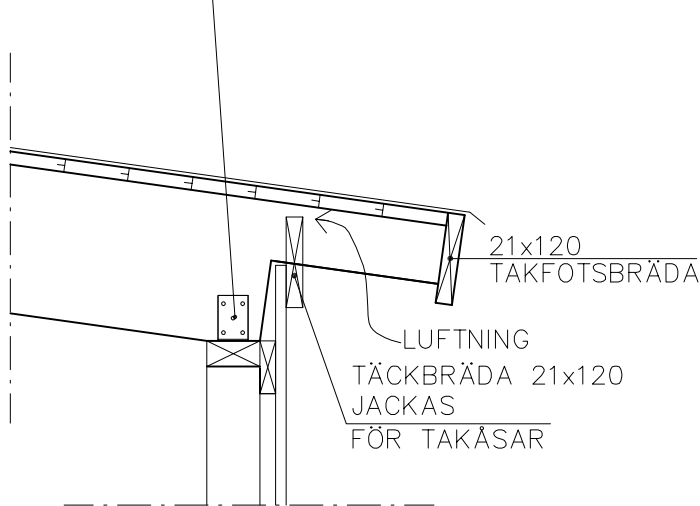


DETALJ C

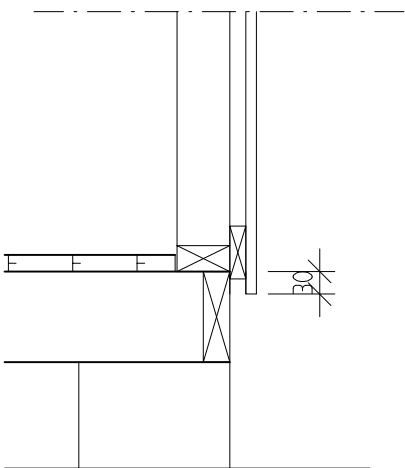


DETALJ D

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
JABO				
Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel.0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV		UPPDRAGSLEDARE	
1156	J.A			
DATUM	ANSVARIG			
2014-09-03				
ROSEN LUND 15 N (Art.nr 5060)				
SEKTION, DETALJER				
SKALA A1/A3	NUMMER			I BET
A3=1:25	A05			

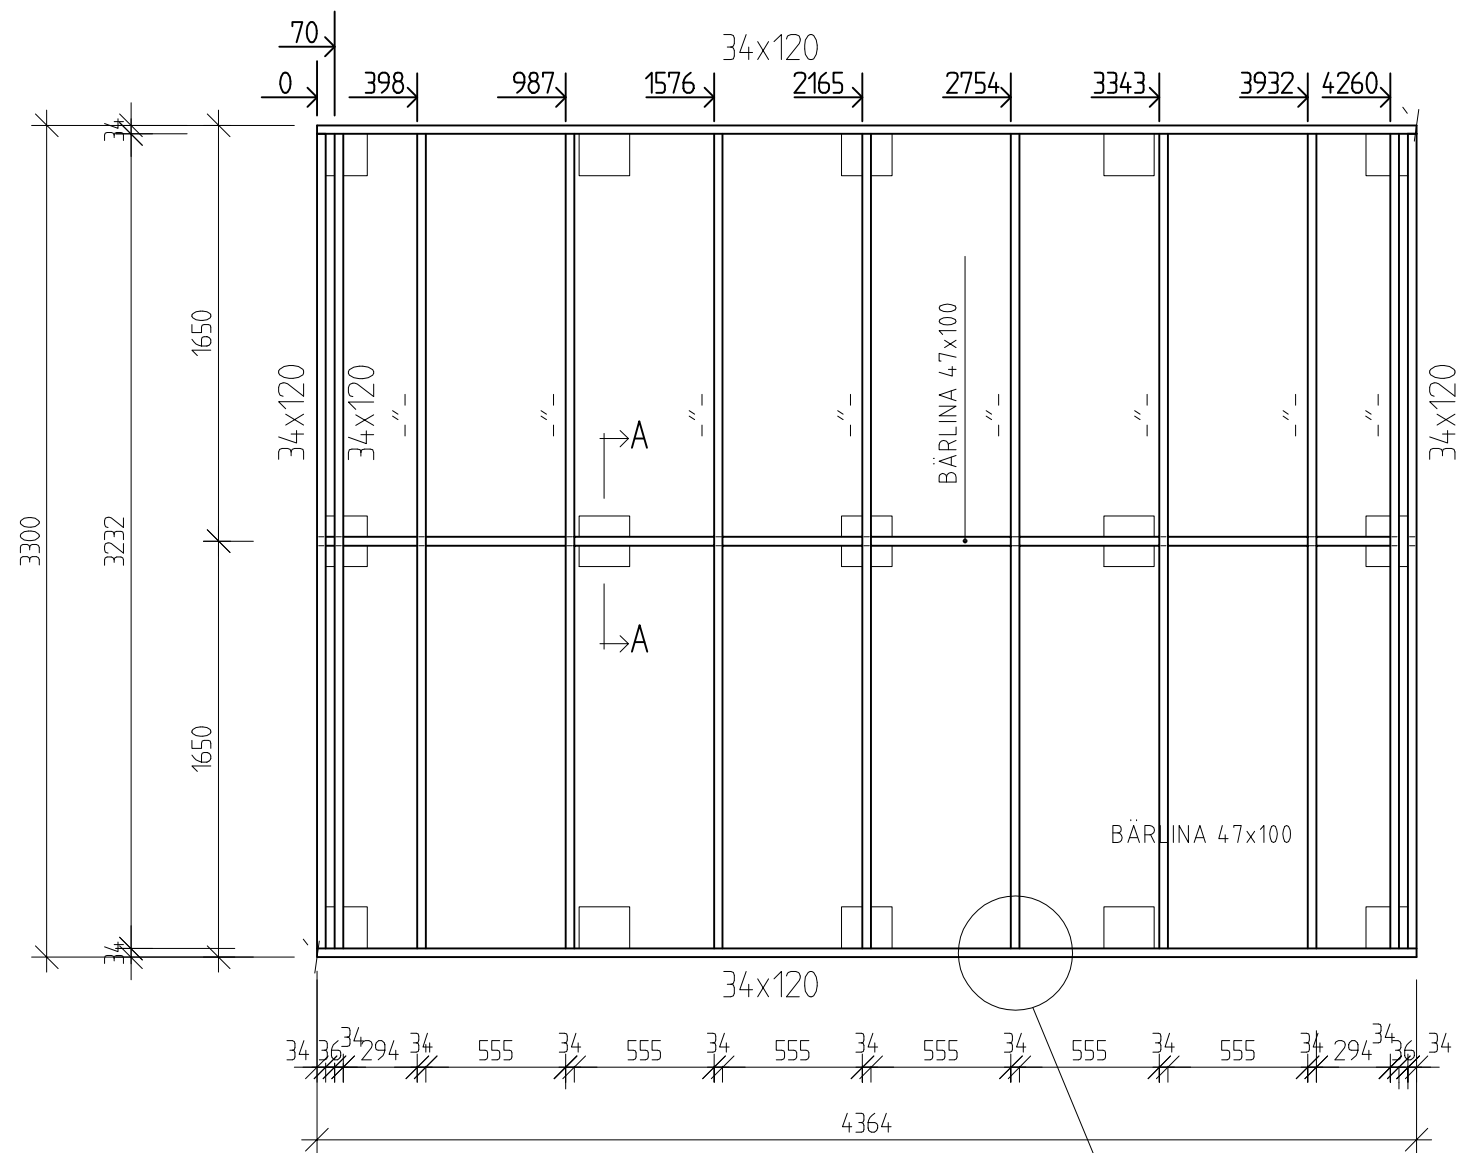


BJÄLKLAGSPLAN

DIAGONAL = 5471 mm

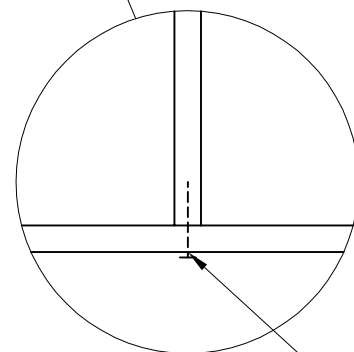

3 st 100x34

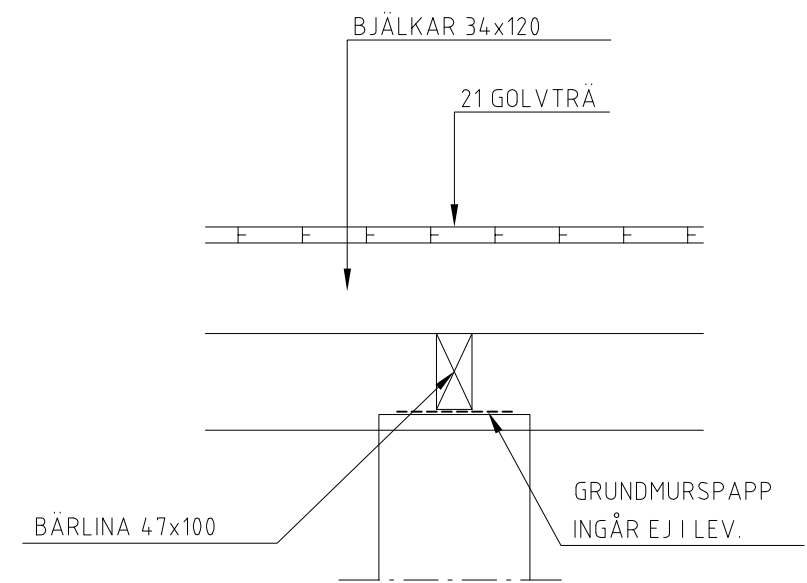

SNITT A-A

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
JABO Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325-66 17 00				
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV		UPPDRAGSLEDARE	
1156	J.A.			
DATUM	ANSVARIG			
2014-09-03				
ROSENLUND 15 N (Art.nr 5060)				
BJÄLKLAGSPLAN				
SKALA	A1/A3	NUMMER	I BET	
1:30, A3		A06		
